



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ประชุมกองแบบแผน
และติดตามการดำเนินงานตามภารกิจ
ครั้งที่ 8/2566
วันพุธที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2566
เวลา 09.00-14.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

โดย นายถาวร ขาวแสง ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2566

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้า ภารกิจประจำกลุ่ม

- ➡ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง 1-13
- ➡ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
- ➡ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
- ➡ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
- ➡ กลุ่มระบบประกอบอาคาร
- ➡ การจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช





กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ (ต่อ)

- ☛ กลุ่มแผนงานและประเมินผล
ติดตามผลการดำเนินงานโครงการและการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
- ☛ กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 - งานการเงินและบัญชี
 - รายงานสถานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566
- ☛ คำสั่งกองแบบแผน จำนวน 4 คำสั่ง
 - คำสั่งที่ 42-45/2566
- ☛ แสดงความยินดี/เสียใจ



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

☛ กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 25 กันยายน 2566

Thank
you!



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗/๐๓.๐๑๘/๗๑

วันที่ ๗

สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามที่กองแบบแผน ได้กำหนดการประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

บัดนี้ เลขานุการการประชุมได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมตรวจสอบรายงานการประชุม และขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขานุการฯ



ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ การดำเนินงานจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

๓.๗ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

๓.๗.๒ การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการ

ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ๑ – ๑๒

กลุ่มออกแบบฯ ๑ อาคารบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือกและคลินิกบริการทันตกรรม ๔ ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่

กลุ่มออกแบบฯ ๒ ทางเดินเชื่อม รพ.สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กลุ่มออกแบบฯ ๓ อาคารห้องประชุม ๒ ชั้นและทางเดินเชื่อมศูนย์อนามัย
ที่ ๓ นครสวรรค์

กลุ่มออกแบบฯ ๔ อาคารบำบัดรักษา คสล. ๓ ชั้น

กลุ่มออกแบบฯ ๕ อาคารอุบัติเหตุ ๑๐ ชั้น รพ.โพธาราม จังหวัดราชบุรี

กลุ่มออกแบบฯ ๖ อาคารพักเจ้าหน้าที่ ๓๒ ยูนิต (แบบมาตรฐาน)

กลุ่มออกแบบฯ ๗ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ ๕ ชั้น

กลุ่มออกแบบฯ ๘ อาคารช่องส่งของสภปรกและบันไดหนีไฟ

(อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ คสล. ๕ ชั้น)

กลุ่มออกแบบฯ ๙ อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙
จังหวัดนครราชสีมา

กลุ่มออกแบบฯ ๑๐ อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน แก่งสะพือ โรงพยาบาล
พิบูลมังสาหาร

กลุ่มออกแบบฯ ๑๑ หลังคาอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

กลุ่มออกแบบฯ ๑๒ ทางเชื่อมอาคาร รพ.สงขลา จังหวัดสงขลา

๓.๘ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๘.๑ งานธุรการ

๓.๘.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๘.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๘.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๘.๕ งานสารบรรณ

๓.๘.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๘.๗ แจ่งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๘.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....

.....

.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแบบแผน กลุ่มบริหารงานทั่วไป โทร. ๐ ๒๑๙๓ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๘๓๒๗

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๓

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

รองผู้อำนวยการกองแบบแผน

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ - ๑๓

หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

หัวหน้างานภายในกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ตามหนังสือกองแบบแผน ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ได้เชิญประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แล้วนั้น

เนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จึงขอเลื่อนการประชุมกองแบบแผนและติดตามภารกิจ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ จากวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ เป็นวันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ตามกำหนดการประชุมที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอให้นำรายงานการประชุมมาเพื่อรับรองต่อไปด้วย

(นางสาวลำพูน แก้วยอด)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

เลขานุการฯ



ระเบียบวาระการประชุม
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖
วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(ถ้ามี)

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เมื่อวันที่อังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ – ๑๓

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร

๓.๖ การดำเนินงานจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช

๓.๗ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

๓.๗.๑ การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

๓.๗.๒ รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

๓.๘ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๘.๑ งานธุรการ

๓.๘.๒ งานการเงินและบัญชี

- รายงานสถานการณ์ทางการเงินกองแบบแผน

๓.๘.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ

๓.๘.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๘.๕ งานสารบรรณ

๓.๘.๖ งานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยีสารสนเทศ

๓.๘.๗ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน

๓.๘.๘ เรื่องแสดงความยินดี/เสียใจ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

.....
.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖

.....

รายงานการประชุมกองแบบแผน

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้มาประชุม

๑. นายถาวร	ชาวแสง	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	ประธาน
๒. นายสรพงษ์	ทัพภวิมล	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มระบบบริการและวิชาชีพ	
๓. นางสาวประภัสสร	จิราภรณ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน	
๔. นางสาวนัชชา	นพคุณ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑	
๕. นายกฤษฎ์	อยู่คง	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒	
๖. นายพรกฤษณ์	แท่นแก้ว	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓	
๗. นายเสรี	ใจเชื้อ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔	
๘. นางสาวทัศนภรณ์	ศรีอภิวัดน์	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕	
๙. นางสาวสุภาพร	กัมมะหยี่	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๖	
๑๐. นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาทุกล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗	
๑๑. ว่าที่ รต.นพพล	บุญย้อย	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘	
๑๒. นางสาวศิริณยา	ศิริลาภ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙	
๑๓. นายบดินทร์	วิบูลย์วัฒน์	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐	
๑๔. นายไพรัช	พงศธรกุล	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑	
๑๕. นายอนุพันธ์	พิริยาสัยสันติ	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒	
๑๖. นายจิระศักดิ์	โลกมิตร	แทนหัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓	
๑๗. นางสาวสริตา	สายสุข	แทนหัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม	
๑๘. นายสรศักดิ์	หอมกลิ่นจันทร์	หัวหน้ากลุ่มระบบประกอบอาคาร	
๑๙. นางสาวลำพูน	แก้วยอด	หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๐. นางสาวกมลจันทร์	ประภากรรัตน	รองหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป	
๒๑. นางสาวทิพวรรณ	รักแจ้ง	หัวหน้างานการเงินและบัญชี	
๒๒. นางจินตนา	คงคาร์ตัน	หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ	
๒๓. นางสาวสุรีย์	อยู่สบาย	หัวหน้างานบริหารทรัพยากรบุคคล	
๒๔. นายธารินทร์	บุญยิ่งเหลือ	หัวหน้างานนโยบาย กิจกรรมพิเศษและเทคโนโลยี	
๒๕. นางสาวจอมขวัญ	แช่มมุก	หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล	เลขานุการ
๒๖. นางสาวอัญชลี	ฉันทวรลักษณ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	ผู้ช่วยเลขานุการ
๒๗. นางภัทรปรียา	กันทาใจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
๒๘. นายสุรัชย์	นามโยธา	ปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)

๑. นายปฏิภาณ	อินทร์ทอง	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๑๓
๒. นายสมศักดิ์	อัครนวลเสรี	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน
๓. นายพงศ์พันธุ์	จิวิสุวรรณ	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๙

/๔.นาย...

๔. นายอับดุลกอเดส อมรีก	รองผู้อำนวยการกองแบบแผน/หัวหน้ากลุ่มออกแบบฯ เขตที่ ๖
๕. นายนิสิต ดิษสาย	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑
๖. นายสุทธิพร ปรีชา	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕
๗. นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘
๘. นายจักรกริสัน แซ่เล้า	หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒
๙. นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์	หัวหน้ากลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
๑๐. นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์	หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ : เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แจ้งคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๖๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป มอบกลุ่มบริหารงานทั่วไปแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ทราบต่อไป

๑.๒ กำหนดการประชุมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระหว่างวันที่ ๒-๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ จังหวัด อุบลราชธานี มอบนายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐ เตรียมพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุมต่อไป

๑.๓ การจัดทำเล่มข้อกำหนดคุณลักษณะและรายละเอียดประกอบแบบการก่อสร้างอาคารสถาน บริการสุขภาพ กองแบบแผน ปี ๒๕๖๖ และเล่มราคาวัดคูปกรณ์ต่อหน่วย กองแบบแผน ปี ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม : รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ : เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ประธานมอบเลขานุการฯ แจ้งรายงานการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรองรายงาน การประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบแล้ว ที่ประชุมพิจารณาแล้วมี มีข้อแก้ไขดังนี้ หน้าที่ ๓ ข้อ ๓.๑.๓ ข้อย่อยที่ ๓ “(สปร)” แก้ไขเป็น “โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์”

มติที่ประชุม : รับรองรายงานการประชุมเมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ : เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

รายงานความก้าวหน้าภารกิจประจำ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของกลุ่มภายในกองแบบแผนทุกกลุ่ม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตาม แผนปฏิบัติการและตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมรายงานปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน โดยหัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้างานหรือผู้แทน

๓.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑- ๑๓ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน และติดตามการ

๓.๑.๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑ โดยนางสาวนัชชา นพคุณ แทน นายนิสิต ดิษสาย

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- การออกแบบเพื่อรับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ADB (Asian Development Bank) งบประมาณ การดำเนินการเป็นปกติ ยังไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน

๓.๑.๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒ โดยนายภุชงค์ อยู่คง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ขอให้เร่งดำเนินการ

๓.๑.๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๓ โดยนายพรภุชงค์ แพนแก้ว

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานของโรงพยาบาลตามที่มีการร้องเรียนผ่านสื่อ ขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เรียบร้อย และโรงพยาบาลกำแพงเพชร ที่เอกชนออกแบบให้ขอให้ช่วยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๓.๑.๔ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ โดย นายนายเสรี ใจชื่อ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดำเนินการเรียบร้อย

การดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการดำเนินงาน ๓ แห่ง โรงพยาบาลอุตุยา จังหวัดอุตุยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนทบุรี และแบบมาตรฐาน

๓.๑.๕ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๕ โดยนางสาวทัศนภรณ์ ศรีอภิวัฒน์ แทน นายสุทธิพร ปรีชา

- ติดตามการดำเนินงานจัดทำผังหลักของโรงพยาบาล ขอให้ดำเนินการให้เรียบร้อย และไม่เกิดปัญหาในการดำเนินงาน
- การออกแบบเพื่อรับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ADB (Asian Development Bank) งบประมาณ การดำเนินการของโรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย อยู่ระหว่างพิจารณาแบบแปลนเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลสีเขียวต่อไป ทางธนาคารฯ จะมีการนัดประชุม ๖ หน่วยงานต่อไป
- นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ สถาปนิกชำนาญการพิเศษ ชี้แจงเพิ่มเติมในการดำเนินงานร่วมกันระหว่างโรงพยาบาล ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) และกองแบบแผน ควรมีการประชุมเพื่อพิจารณาร่วมกันหาข้อตกลงร่วมกัน โรงพยาบาลจะต้องเป็น Green Hospital ซึ่งทางธนาคารฯ จะพิจารณาว่าการดำเนินงานคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือไม่ สามารถดำเนินการได้หรือไม่ และได้ผลคุ้มค่าหรือไม่ เช่น โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ที่นำแบบของโรงพยาบาลรอยัลเอ็ดมาก่อสร้าง เบื้องต้นจะมีการลงทุนงบเงินกู้ ๒ โรงพยาบาล คือ (๑) โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี (๒) โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการพิจารณา

- ประธานฯ แจ้งว่าการออกแบบของกองแบบแผน เป็นการออกแบบที่เป็นการอนุรักษ์พลังงาน เป็นไปตามกฎกระทรวง และสิ่งแวดล้อมที่กำหนด

๓.๑.๖ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๖ โดย นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ แทน นายอัศุลกอดส อมริ่ง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลปลวกแดง ๒ จังหวัดระยอง ที่จะเป็นการลงทุนของเอกชน เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จขอให้ทำหนังสือแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองทราบด้วย
- การดำเนินงานเพื่อขอรับงบประมาณจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB) ให้ความเห็นเช่นเดียวกับนายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์นายบดินทร์ วิบูลย์วัฒน์ และขอเสริมเรื่องของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งจะเกี่ยวกับราคาของการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาต่อไป

๓.๑.๗ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗ โดยนายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด การดำเนินงานเรียบร้อย และการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูคินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ การดำเนินงานเป็นไปตามที่หารือร่วมกันระหว่างกองแบบแผนกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภูคินารายณ์

๓.๑.๘ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘ โดย ว่าที่ รต.นพพล บุญย้อย แทนนายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ และไม่มีติดตามการดำเนินงาน

๓.๑.๙ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ โดยนางสาวศิริณยา ศิริลาภ แทนนายพงศ์พันธุ์ จิวสุวรรณ

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานนโยบายต่าง ๆ รายงานว่าดำเนินงานเรียบร้อย

๓.๑.๑๐ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐ โดย นายบัณฑิต วิบูลย์วัฒน์

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานของกรมสุขภาพจิต ศูนย์ยาเสพติด ศูนย์ผู้สูงอายุ ศูนย์การอบรม โดยใช้พื้นที่ของโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จะมีการลงพื้นที่เพื่อนำเสนอผังแม่บทในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓.๑.๑๑ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑ โดยนายไพรัช พงศกรกุล

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- การติดตามงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง ผลการตรวจสอบดิน รายงานว่าดำเนินงานเรียบร้อยแล้ว

๓.๑.๑๒ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒ โดย นายอนุพันธ์ พิริยาสัยสันติ แทน นายจักรกริสัน แซ่เล่า

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามโรงพยาบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี ในส่วนของการร่วมทำราคากลางขอให้เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

๓.๑.๑๓ กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓ โดย นายจิระศักดิ์ โลกมิตร แทนนายปฏิภาณ อินทร์ทอง

- ไม่มีการรายงาน งานนโยบายสำคัญ
- ติดตามการดำเนินงานคำนวณค่า K ของโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ ของกรมสุขภาพจิต ที่ต้องการคืนโดยไม่ต้องส่งไปสำนักงบประมาณ

๓.๑.๑๔ การดำเนินงานโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช โดยนางสาวประภัสสร จิราภรณ์

- แจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจำนวน ๗ แห่งตามตัวชี้วัด การดำเนินงานประมาณร้อยละ ๘๐ งานระบบประกอบอาคารประมาณร้อยละ ๒๐
- ติดตามการดำเนินงานอาคาร ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากกองคมนตรึจะลงไปติดตามการดำเนินงานในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวสุภาพร กำมะหยี่ ชี้แจงว่าเหตุที่การดำเนินงานล่าช้าเนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน

- การดำเนินจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขอให้ดำเนินการให้ครบถ้วนถึงงานระบบประกอบอาคารด้วย ซึ่งที่ประชุมหารือว่างานระบบจะต้องเป็นแบบแปลนหรือทำเป็นเอกสารประกอบได้ ที่ประชุมให้ความเห็นว่าควรทำเป็นเอกสาร ๑ แผ่น เพื่อง่ายต่อการดำเนินงานและตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจตัวชี้วัด

มติที่ประชุม : มอบทุกกลุ่มดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายและร้องขอ และติดตามงานค้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดระยะเวลา

๓.๒ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ โดยนายสรพงษ์ ทัพภวิมล รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม) และรายงานผลการดำเนินงานเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หน่วยบริการ

- มีการจัดทำเอกสารสรุปประเภทงาน ๕ ประเภท (๑) ผังแม่บท (๒) ผังบริเวณ (๓) การออกแบบ (๔) การควบคุมงาน (๕) การอบรมหลักสูตร และอัตราค่าบริการ เสนอนายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เพื่อให้กองกฎหมายพิจารณา มีการปรับแก้ไขเพื่อให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพสามารถดำเนินการได้ด้วย และมีการแก้ไขตามข้อท้วงติงให้ครบถ้วน และจะเสนอใหม่ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งในการจัดทำเอกสารประเภทงานนั้น

- ประธานฯ มอบให้ศึกษากฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับเงินบำรุง เพื่อนำงบประมาณจากการดำเนินงานของกองแบบแผนเพื่อนำไปใช้จ่ายในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าตอบแทนตามวิชาชีพ

๒. การดำเนินงาน one stop service ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน

๓. การจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจกองแบบแผนให้กับส่วนภูมิภาค เพื่อเตรียมเป็นศูนย์ Training เพื่อเตรียมเก็บค่าบริการในอนาคต ขอให้เชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาร่วมปรึกษาหารือ ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ให้จัดทำหลักสูตรอย่างน้อย ๑-๒ หลักสูตร เพื่อนำเรียนอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งการจัดทำหลักสูตรขอให้คนภายนอกสามารถเข้ารับการอบรมได้ด้วย

๓.๓ กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม โดยนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์

- ไม่มีการรายงานผลการดำเนินงาน เนื่องจากนายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ หัวหน้ากลุ่มฯ เดินทางไปราชการต่างประเทศ งาน Expo Osaka ณ ประเทศญี่ปุ่น

- ประธานฯ สอบถามการจัดหาโปรแกรมลิขสิทธิ์ที่ได้มีการเสนอมางบประมาณ ประมาณ ๑๕ ล้านบาท นางสาวลำพูน แก้วยอด นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป แจ้งว่ามี การนัดประชุมระหว่างกองแบบแผน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มแผนงาน กองกฎหมาย โดยมีนายอาคม ประดิษฐ์สุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานที่ประชุม กำหนดการประชุมในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน

๓.๔ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม โดย นางสาวสริตา สายสุข แทนนางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

- การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑๒ แบบ ภายใต้โครงการฯ จะมีการลงพื้นที่เพื่อดำเนินงานในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ การดำเนินงานจะแล้วเสร็จทันตามแผนการดำเนินงาน

๓.๕ กลุ่มระบบประกอบอาคาร โดยนายสรศักดิ์ หอมกลิ่นจันทร์

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ตามข้อ ๓.๒-๓.๕ และมอบหัวหน้ากลุ่มติดตามการดำเนินงานและดำเนินงานให้แล้วเสร็จ

๓.๖ กลุ่มแผนงานและประเมินผล โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

๓.๖.๑ ติดตามการดำเนินงานครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ และ ๑ แผนปฏิบัติการ ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบรายงานการประชุม

๓.๖.๒ การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการตามเอกสารนำเสนอที่ประชุมและแนบรายงานการประชุม

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๒ ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๑.๒.๑ และ ๑.๒.๒ ให้กลุ่มแผนงานและประเมินผลเพื่อเสนอผู้อำนวยการกองแบบแผน และนำเรียนรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพในกำกับ ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

๓.๗ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

๓.๗.๑ งานการเงินและบัญชี โดยนางสาวทิพวรรณ รักแจ้ง

- รายงานสถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ (ตามเอกสารเสนอที่ประชุมและเอกสารแนบรายงานการประชุม)

- แจ้งกำหนดระยะเวลาการส่งใบสำคัญและการเบิกจ่ายงบประมาณ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

๓.๗.๒ งานธุรการ โดยนางสาวกมลจันทร์ ประภากรรัตน

- แจ้งการขอแบบแปลน งวดงาน-งวดเงินจากหน่วยงานภายนอก ขอให้ทุกกลุ่มนำส่งเอกสารประกอบการขอมาเป็นชุดเอกสารเนื่องจากผู้รับผิดชอบจะจัดทำในคราวเดียว ไม่มีการแยกดำเนินการเหมือนที่ผ่านมา

- แจ้งการขออนุมัติช่างควบคุมงานก่อสร้าง ขอให้ทุกกลุ่มดำเนินการโดยเร็ว เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว

- แจ้งการจัดส่งแบบแปลนให้หน่วยงานภายนอก จะจัดส่งเป็นไฟล์ จัดส่งเป็นเอกสาร

- แจ้งการส่งหนังสือขออนุมัติไปราชการต่าง ๆ ผ่านช่องทางไลน์ เนื่องจาก

- แจ้งตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการที่ว่างลง ขอความอนุเคราะห์ผู้อำนวยการกองแบบแผนขอตำแหน่งดังกล่าวคืนจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

๓.๗.๓ งานพัสดุและยานพาหนะ โดยนางจินตนา คงคาร์ตัน

- แจ้งการจัดซื้อน้ำดื่มสำหรับบริการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เนื่องจากมีการทวงคืนจากกลุ่มตรวจสอบภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

- แจ้งการส่งเอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ ขอให้ส่งเอกสารโดยเร็ว เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ไม่เกิดข้อผิดพลาด ไม่มีการเบิกจ่ายตอนใกล้สิ้นปี

๓.๗.๔ งานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยนางสาวสุรีย์ อยู่สบาย

- แจ้งการส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเงินเดือนรอบ ๒ ขอให้จัดส่งให้โดยเร็ว เพื่อรวบรวมส่งกองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขาธิการกรม

- ประธานฯ แจ้งการสแกนเข้าปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ขอให้มีความรอบคอบในการสแกน และการเข้าปฏิบัติหน้าที่ไม่ควรมาสายบ่อยครั้ง ซึ่งอาจจะเกินกำหนดระยะเวลาตามระเบียบได้

- ที่ประชุมสอบถามการประเมินว่าเป็นหน้าที่ของรองผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากลุ่ม ซึ่งเป็นการบริหารจัดการภายในของแต่ละกลุ่ม

๓.๗.๕ แจ้งคำสั่งกองแบบแผน จำนวน ๓ คำสั่ง โดย นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก

- คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๓๘-๔๐/๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานการเงินเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน เพื่อไม่ให้มีงบประมาณคงเหลือตอนสิ้นปีงบประมาณ มอบผู้รับผิดชอบที่จะใช้งบประมาณจัดทำแผนการใช้จ่ายส่งให้งานการเงินภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

การนำเสนอแบบประกอบการของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑-๑๓ และกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย ในรูปแบบ one page (ตามเอกสารนำเสนอที่ประชุม)

- กลุ่มที่มีการนำเสนอ one page ประกอบด้วย กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๑๐,๑๒,๑๓ และกลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย

- กลุ่มที่ไม่มีการนำเสนอ one page ประกอบด้วย กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙ และ ๑๑ กำหนดให้ส่งข้อมูลโดยเร็ว เพื่อนำเสนออธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทราบต่อไป

- นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล ประธานคณะทำงานโครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) ขอความร่วมมือจากทุกกลุ่มส่งข้อมูลการจัดทำแบบประกอบคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงการประมาณราคา งวดงาน-งวดเงิน ให้คณะทำงานภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในระบบข้อมูลแบบพร้อมใช้ ใน website กองแบบแผน และเป็นข้อมูลสำหรับให้กองบริหารการสาธารณสุขใช้เป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาแบบของโรงพยาบาลที่มีการของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปวันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม : รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.


นางสาวจอมขวัญ แซ่มุก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน

២៥ រ.ក.៦៦ រីឯ ២៨ រ.ក.៦៦

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑	๑	๐				๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ								
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๑	๐				๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑						
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๑	๑	๐				๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๑	๐				๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๑	๑						
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๑	๑						
๑๕	ประชุม	๑๔	๑๔						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๒๘	๒๘						
	รวม	๕๑	๕๑	๐	๐	๐	๐	๐	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ ก.ค.๖๖ ถึง ๒๘ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑลศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ (หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑- ๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔- ๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตย์กรรม	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	งานพิจารณาค่า K	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๓๖	๓๖	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๖๓	๖๓	๐	๓	๐	๓	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๒

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ										
๑	พช ๐๐๓๓.๓๐๑/๖๗๗๐	๔๒๑	๒๕ พ.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจัดทำ ผังบริเวณหลัก	รพ.ศรีเทพ	เพชรบูรณ์	นายเอกชัย			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สท ๐๐๓๓.๔๐๑/๒๙๘๘	๔๖๓	๘ ธ.ค. ๖๕	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผัง บริเวณ(Masterplan) โรงพยาบาล ศรีสัชชนาลัย	รพ.ศรีสัชชนาลัย	สุโขทัย	นายเอกชัย			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ										
๑	อต ๐๐๓๓.๑๐๑.๑/๑๙๑๖	๙๕	๒๘ ก.พ. ๖๖	ขอรับการสนับสนุนเขียนแบบ แปลนอาคารวินิจฉัยและ บำบัดรักษา โรงพยาบาลอุตรดิตถ์	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	นายภุชงค์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ										
๑	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๔๘๖	๓๓๗	๒๑ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน และเอกสารประกอบการก่อสร้าง ทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารผ่าตัด กับอาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.วังทอง	จ.พิษณุโลก	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๔. ตรวจสอบรับรองแบบ										
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)										
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา										
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน										

๘. ตรวจสอบเช็คผัง										
๙. ตรวจสอบการจ้าง/ตรวจสอบรับพัสดุ										
๑	อติ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๘๔๑	๓๕๖	๗ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุมตรวจรับงาน อาคารผู้ป่วยพิเศษ ๑๒ เตียง รพ.พิชัย งวดที่ ๑ วันที่ ๗ ส.ค.๖๖	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๖๐๕	๓๕๗	๗ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุม อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง (พร้อมลิฟต์) งวดที่ ๔ วันที่ ๘ ส.ค.๖๖	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายวุฒิศักดิ์ นายเอกชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	สท ๐๐๓๓.๘๐๑/๗๐๓	๓๕๙	๙ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุม อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง งวดที่ ๘ รพ.บ้านด่าน ลานหอย วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๖	รพ.บ้านด่านลานหอย	สุโขทัย	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	พช ๐๐๓๓.๐๐๑/วิ๓๕๑๒	๓๘๒	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอเชิญประชุมตรวจงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก รพ.หล่มสัก งวดที่ ๑๓ วันที่ ๒๒ ส.ค. ๖๖	ศาลากลางจังหวัด เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายวุฒิศักดิ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๕๖๒	๓๙๕	๒๘ ส.ค. ๖๖	ขอเชิญประชุมตรวจรับพัสดุ อาคารบำบัดรักษา ๖ ชั้น งวดที่ ๑๙ และ ๒๐ รพ.เพชรบูรณ์วันที่ ๒๘ ส.ค.๖๖	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายวุฒิศักดิ์ นายเอกชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร										
๑๑. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑	พร ๐๐๓๓.๐๐๑/๔๔๕๐	๓๗๑	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขออนุเคราะห์ตรวจสอบ Shop Drawing ถังบำบัด อาคารผู้ป่วย นอก รพ.ลอง	รพ.ลอง	แพร่	-			ส่งผิด คินเรื่อง
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม										
๑	พล ๐๗๓๓.๓๐๑/๑๖๘๘	๓๗๗	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขออนุมัติใช้ผ้า ที่-บาร์อูมิเนียม อาคารผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	นายเอกชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

[illegible]

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน										
๑	อติ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๖๐๗	๓๔๘	๒๔ ก.ค. ๖๖	ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดอุดรดิตถ์ และขอรับการสนับสนุนผู้ควบคุม งาน อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น รพ. ลับแล	สสจ. อุดรดิตถ์	อุดรดิตถ์	นายอวยชัย			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สธ ๑๑๐๔.๐๔/๑๐๘๘	๓๖๒	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วม เป็นผู้ควบคุมงาน อาคารเรียน และหอพักนักศึกษา	วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร	พิษณุโลก	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒
๓	พช ๐๐๓๓.๐๐๑/๕๔๔๕	๓๗๘	๒๓ ส.ค. ๖๖	แจ้งความประสงค์ขอผู้ควบคุมงาน อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ๔ ชั้น รพ.หล่มสัก, อาคารผู้ป่วย นอก-อุบัติเหตุ ๓ ชั้น รพ.หนองไผ่	รพ.หนองไผ่	เพชรบูรณ์	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒
๔	สท ๐๐๓๓.๔๐๑/๑๖๔๓	๓๘๑	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอสนับสนุนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ ๓ ชั้น	รพ.ศรีสขนาลัย	สุโขทัย	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒
๕	สท ๐๐๓๓.๖๐๑/๑๙๔๖	๓๙๑	๒๕ ส.ค. ๖๖	ขอสนับสนุนผู้ควบคุมงาน	รพ.สวรรคโลก	สุโขทัย	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒
๖	สท ๐๐๓๓.๑/๔๕๐๐	๓๙๒	๒๕ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ ๗๒ ยูนิต	รพ.สุโขทัย	สุโขทัย	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ										
๑	สธ ๑๑๐๔.๐๔.๐๓/๑๐๐๐	๓๓๖	๒๑ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้า ร่วมเป็นคกก.ตรวจรับพัสดุ อาคาร เรียนและหอพักนักศึกษา	วิทยาลัยการ สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก	พิษณุโลก	-			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	พล ๐๗๓๒.๓๐๑/๑๖๗๔	๓๘๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วม เป็นคกก.อาคารพักเจ้าหน้าที่	รพ.วังทอง	พิษณุโลก	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒
๑๕. ประชุม										
๑	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๓๑๑๘	๓๓๙	๒๑ ก.ค. ๖๖	ขอเชิญประชุมพิจารณา ข้อกำหนดคุณลักษณะวัสดุ อุปกรณ์และรายละเอียดประกอบ แบบการก่อสร้างอาคารสถาน บริการสุขภาพและเล็มราคา มาตรฐานต่อหน่วย กองแบบแผน วันที่ ๑๙ ก.ค. ๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ กองแบบแผน	กองแบบแผน	นนทบุรี	น.ส. สุวรรณี			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๓๑๕๓	๓๔๔	๒๑ ก.ค. ๖๖	เชิญประชุมหารือความต้องการ ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ กองแบบแผน วันที่ ๔ ส.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กองแบบแผน	กองแบบแผน	นนทบุรี	นายฤกษ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	พช ๐๐๓๓.๒๐๑/๔๙๑	๓๔๖	๒๔ ก.ค. ๖๖	ร่วมประชุมเร่งรัดงานจ้างก่อสร้าง และจัดทำแผนการทำงานใหม่ ตามมาตรการเร่งรัดการ ปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับ ความช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับ เป็นร้อยละ ๐ อาคารบำบัดรักษา รพ.เพชรบูรณ์ วันที่ ๒๕ ก.ค.๖๖	รพ.เพชรบูรณ์	เพชรบูรณ์	นายวุฒิศักดี			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	อติ ๐๐๓๓.๐๐๑/๒๘๕๗	๓๕๘	๗ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุม อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น รพ.ลับแล วันที่ ๘ ส.ค.๖๖	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดี			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๖	สท ๐๐๓๓.๔๐๑/๑๕๓๑	๓๖๑	๑๑ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุม ก่อสร้างบำบัดน้ำเสีย รพ.ศรีสขนาลัย	รพ.ศรีสขนาลัย	สุโขทัย	นายภูดิศ			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	อติ ๐๐๓๓.๓๐๖/๓๙๖๒	๓๗๖	๑๖ ส.ค. ๖๖	เข้าร่วมประชุม อาคารผู้ป่วยนอก รพ.พิชัย ในวันที่ ๒๑ ส.ค.๖๖	รพ.พิชัย	อุตรดิตถ์	นายวุฒิศักดี			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๕๖๔	๓๗๒	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	นนทบุรี	นายฤกษ์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	สธ ๐๗๐๑.๘/๓๔๒๔	๓๙๓	๒๕ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนด ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง อาคารสำนักงานศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพที่ ๒ (ชั่วคราว) วันที่ ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น. ห้อง ๖ ชั้น	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายวุฒิศักดี น.ส.วชิราพร			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๐	สธ ๐๒๐๗.๐๓.๒/๒๒๓๕๗	๓๙๔	๒๕ ส.ค. ๖๖	ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำ ของประมาณรายจ่ายประจำปี วันที่ ๒๘-๒๙ ส.ค.๖๖	สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข กอง บริหารการสาธารณสุข	นนทบุรี	นายกฤษณ์ นส.ปณิตตา			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๖. อื่นๆ										
๑	อว ๖๕๐๑.๑๓/๑๒๑๒	๓๓๔	๒๐ ก.ค. ๖๖	เป็นวิทยากรในงานปฐมนิเทศ โครงการ "ร่วมออกแบบ รพ. ชุมชนสุขภาวะ" มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วันที่ ๒๑ ก.ค.๖๖	คณะสถาปัตยกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	กรุงเทพฯ	นายกฤษณ์ นส.กุลนันท์			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๖๗๖	๓๓๕	๒๑ ก.ค. ๖๖	แบบสอบถามความคิดเห็น บุคลากรกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ ด้านบริหารทรัพยากร บุคคล	กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	สธ ๐๗๐๑.๑/๖๒๘๗๘	๓๓๘	๒๑ ก.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	สธ ๐๗๐๑.๑/๒๙๑๔	๓๔๐	๒๑ ก.ค. ๖๖	ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติ ราชการประจำสัปดาห์ของ ผู้บริหารระดับสูง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	สธ ๐๗๐๑.๑/๖๒๙๖๐	๓๔๑	๒๑ ก.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๗๐๐	๓๔๒	๒๑ ก.ค. ๖๖	การประชุมสัมพันธข้าราชการ ผู้สนใจไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑-๑๒	กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๐	๓๔๓	๒๑ ก.ค. ๖๖	แจ้งเลื่อนการประชุมกองฯ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (จาก ๒๔ กค เป็น ๒๕ กค ๖๖)	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	สธ ๐๗๐๒.๐๕.๔/๒๓๕๖	๓๔๕	๒๑ ก.ค. ๖๖	ลับ	กองกฎหมาย	นนทบุรี				ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	สธ ๐๗๐๑.๑/๒๒๘๘๓	๓๔๗	๒๔ ก.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๗๐	๓๔๙	๒๖ ก.ค. ๖๖	ประชุมสัมพันธทุนฝึกอบรมของ รัฐบาลอินเดีย หลักสูตร "Specialized Training Programme for Establishing National, Regional Telemedicine Platform for Primary Health in Resource Limited Settings	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๗๑	๓๕๐	๒๖ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบคำขอทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	สธ ๐๗๑๑.๑/๒๓๐	๓๕๑	๒๖ ก.ค. ๖๖	ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรครูสมาธิ รุ่นที่ ๕๐	กลุ่มงานจริยธรรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	สธ ๐๗๐๒.๐๔.๔/๒๔๗๗	๓๕๓	๒๗ ก.ค. ๖๖	ขอแจ้งคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๖๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	กองกฎหมาย	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๐๓๘	๓๕๔	๒๗ ก.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๖ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๘๐๑	๓๕๕	๒๗ ก.ค. ๖๖	การจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๒๙๓๗	๓๖๐	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอส่งแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๐๘๘	๓๖๓	๑๑ ส.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๙	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๕๓๑	๓๖๔	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอเชิญหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมจัดแสดงบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการในการประชุมวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๘๘๐	๓๖๕	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอส่งคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๑๓๔	๓๖๖	๑๑ ส.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๑๓๖	๓๖๗	๑๑ ส.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๑	๓๖๘	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	สธ ๐๗๒๘/๓๐๒	๓๖๙	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของผู้รับบริการ รอบ ๑๑ เดือน	ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์	นครสวรรค์	นายสืบสกุล			ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒๕	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๓๖๐๐	๓๗๐	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอแจ้งสรุปรายการขอใช้ โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการ ปฏิบัติงานภายในกองแบบแผน	กองแบบแผน	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๖	อติ ๐๐๓๓.๑๐๑.๒/๗๐๔๘	๓๗๓	๑๑ ส.ค. ๖๖	ส่งสำเนานบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม แนบท้ายสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๓/๒๕๖๔ ลว.๑๙ต.ค.๖๖ (ครั้งที่ ๓) อาคารวินิจฉัยและรักษา	รพ.อุตรดิตถ์	อุตรดิตถ์	-			ส่งหนังสือแจ้ง หน่วยงานที่ร้อง ขอ ทำหนังสือ ไปยัง ศบส. เขต ๒
๒๗	สธ ๐๗๐๑.๑/๖๓๒๘๙	๓๗๕	๑๖ ส.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๑๐๐	๓๗๙	๒๓ ส.ค. ๖๖	แผนการพัฒนาศูนย์กลางราย ตำแหน่ง กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	กลุ่มงานพัฒนาศูนย์กลาง	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๙	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๓๐๖๘	๓๘๓	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอความร่วมมือตอบ แบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการ พัฒนาศูนย์กลาง กรมสนับสนุน บริการสุขภาพ	กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๐	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๑๐๓๐	๓๘๔	๒๓ ส.ค. ๖๖	ชักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ราชการของกรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๑	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๓	๓๘๕	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองฯครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (จากวันที่ ๒๘ สค ๖๖ เป็นวันที่ ๓๐ สค ๖๖)	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๑๐๘	๓๘๖	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบ สำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตของ ข้าราชการพลเรือนสามัญ	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๓๐	๓๘๗	๒๓ ส.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๔	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๔๒๙	๓๘๘	๒๓ ส.ค. ๖๖	แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	สำนักงานเลขานุการกรม	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๕	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๐๓๙	๓๘๙	๒๓ ส.ค. ๖๖	ขอเชิญร่วมบริจาคและสมทบทุน การจัดสร้างพระสัมพุทธเมตตา ประชากรักษ์ เป็นพระพุทธรูป ประธาน กรม สบส. ครบรอบ ๒๐ ปี	กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓๖	สธ ๐๗๑๐.๐๓/๙๔๔	๓๙๐	๒๓ ส.ค. ๖๖	ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วม ประชุมสัมมนาโครงการจัดทำ บัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ผ่านช่องทาง Facebook และ Youtube	กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร	นนทบุรี	นายสืบสกุล			ดำเนินการ แล้วเสร็จ

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงานรอบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	ค้างสะสมเดือนก่อน (4)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (5)	คงเหลือค้างสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	0	0	0	1	0	1	1	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	3	1	2	0	0	0	2	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	1	0	1	0	0	0	1	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	0	0	0	1	1	0	0	
7	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	2	2	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	21	21	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	1	1	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	12	3	9	0	0	0	9	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	3	3	0	0	
	11.3 งานมณฑลศิลป์	0	0	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	2	2	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	3	3	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	3	3	0	0	0	0	0	
15	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	2	2	0	0	0	0	0	
16	หนังสือเวียน / อื่นๆ	3	3	0	0	0	0	0	
	รวม	53	41	12	5	4	1	13	



(นายพรกฤษณ์ แท่นแก้ว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 3

7. แบ่งงานงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8.1 งานสถาปัตยกรรม											
1	นว 0033/1831	347	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ฝ้าเพดาน อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
2	นว 0033/1824	348	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ประตู่เหล็กกันไฟ อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
3	นว 0033/1827	349	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ผู้ติดตั้งวงกบและ กรอบประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคาร พักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
4	นว 0033/1820	350	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุระบบกันซึมและกันความ ร้อนพื้นลาดฟ้า อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
5	นว 0033/1816	351	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุจุกบันได และบัวเชิง ผนังพีวีซี อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต รพ. ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
6	นว 0033/1817	352	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุหินขัดสำเร็จรูป อาคาร พักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
7	นว 0033/1818	353	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุกระเบื้องยางปูพื้น อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
8	นว 0033/1819	354	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุแผ่นกันรังสีความร้อน อาคารพักแพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
9	นว 0033/1821	355	24 ส.ค. 66	ขออนุมัติใช้วัสดุสีทาอาคาร อาคารพัก แพทย์ 24 ยูนิต รพ.ตาคลี	โรงพยาบาลตาคลี	นครสวรรค์	คุณอลิสา				กำลัง ดำเนินการ
8.2 งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
8.3 งานมัณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)				
9. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)				
10. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)				

11. หนังสือเวียน / อื่นๆ

(ไม่มีงานคงค้าง)

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานการทำงานประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	ค้างสะสมเดือนก่อน (4)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (5)	คงเหลือค้างสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	5	2	3	6	1	5	8	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	4	1	3	3	2	1	4	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	1	0	1	1	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	1	1	0	1	0	1	1	
7	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	13	13	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบ/อาคาร	3	2	1	0	0	0	1	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	1	0	1	1	
	11.3 งานมณฑลศิลป์	5	5	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	5	5	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการ	3	3	0	0	0	0	0	
15	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	2	2	0	0	0	0	0	
16	หนังสือเวียน / อื่นๆ	3	2	1	0	0	0	1	
	รวม	44	36	8	12	3	9	17	



(นายเสรี ใจชื่อ)

นายช่างเครื่องกลอาวุโส

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 4

รายงานสรุปผลปฏิบัติการการทำงานประจำเดือน รอบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 4

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ											
1	ปท 0033.3/857	288	30 มี.ค. 66	ขอสำรวจและออกแบบทางเดินเชื่อม อาคาร (Cover Way)	รพ.คลองหลวง	ปทุมธานี	คุณเอกชัย คุณ คงฤช คุณ พรฤชณ				กำลังดำเนินการ
2	ปท 0033.3/1708	405	20 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและ ออกแบบ อาคารผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน	รพ.คลองหลวง	ปทุมธานี	คุณเอกชัย/คุณ คงฤช/คุณวัชร ภรณ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
3	อย 0033.201.1/2448	420	30 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์จัดทำผังแม่บท	รพ.เสนา	พะนครศรีอยุธยา	คุณเอกชัย / คุณ คงฤช				กำลังดำเนินการ
4	นบ 0033.301.3/729	423	03 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่ และ ออกแบบผังหลัก	รพ.บางบัวทอง	นนทบุรี	คุณเอกชัย / คุณ คงฤช				กำลังดำเนินการ
5	สบ 0033.301/1050	454	19 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนผัง แม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	รพ.หนองแค	สระบุรี					กำลังดำเนินการ
6	อย 0033.201.1/2814	467	03 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์วัดพื้นที่ วางผัง ก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 4 ชั้น	รพ.เสนา	อยุธยา	คุณพรฤชณ คุณ เอกชัย คุณคงฤช				กำลังดำเนินการ
7	นบ 0033.301.6/769	496	25 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์การออกแบบผัง	รพ.บางบัวทอง 2	นนทบุรี					กำลังดำเนินการ
8	อท 0033.2/3854	497	25 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจพื้นที่ และ ช่วยออกแบบอาคารจ่ายกลาง- ซีกฟอกใหม่	รพ.อ่างทอง	อ่างทอง					กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ											
1	นบ 0033.01.4/882	188	02 กพ. 66	ขอออกแบบอาคารสำนักงาน สสจ. นนทบุรี	สสจ.นนทบุรี	นนทบุรี	คุณเอกชัย	-	-	-	กำลังดำเนินการ

2	สบ 0033.301.3/10678	479	11 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ ประมาณราคา ซ่อมแซมอาคาร ผู้ป่วยนอก รพ.มวกเหล็ก	รพ.มวกเหล็ก	สระบุรี	คุณเอกชัย คุณ วัชรินทร์ คุณ วัชรพร คุณ คงฤช / งาน ระบบประกอบ อาคาร	-	-	-	กำลังดำเนินการ
3	สบ 0033.301.3/3037	480	11 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบ ประมาณราคา งานซ่อมแซมอาคาร ผู้ป่วยนอกและอาคารผู้ป่วยใน รพ. หนองโดน	รพ.หนองโดน	สระบุรี	คุณเอกชัย คุณ วัชรินทร์ คุณ วัชรพร / งาน ระบบประกอบ อาคาร	-	-	-	กำลังดำเนินการ
4	สบ 0033.301/3109	488	21 ส.ค. 66	ขอใช้แบบอาคารผู้ป่วย 60 เตียง (พร้อมลิฟท์)	สสจ.สระบุรี	สระบุรี	คุณเอกชัย	-	-	-	กำลังดำเนินการ
3. ปรึกษาแบบ / คั้นหาแบบ											
1	ปท 0033.3/05/420	281	27 มี.ค. 66	ขอรับการสนับสนุนแบบพิมพ์เขียว จำนวน 3 ชุด ใช้ในการก่อสร้าง อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน ตามแบบ เลขที่ 10410	รพ.ลำลูกกา	ปทุมธานี	คุณเอกชัย	-	-	-	กำลังดำเนินการ
4. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)											
5. ทำเอกสารประกอบแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)											
6. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา											
1	อย 0033.001/2690	324	24 เม.ย.66	ขอบัญชีปริมาณราคา แบบก่อสร้าง และเอกสารประกอบแบบ รายการ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น รพ. ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	รพ.ภาชี	พระนครศรีอยุธยา	คุณเอกชัย คุณ คงฤช	-	-	-	กำลังดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน-งวดเงิน (ไม่มีงานคงค้าง)											
8. ตรวจเช็คค่าง (ไม่มีงานคงค้าง)											
9. ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร											
1	สบ 0033.001/2/3238	500	28 ส.ค. 66	ขอรับการสนับสนุนตรวจสอบงาน ครุภัณฑ์ อาคารสสจ.	สสจ.สระบุรี	สระบุรี		-	-	-	กำลังดำเนินการ
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)											

11.1 งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา											
1	อย 0033.1/5426	348	16 พ.ค. 66	ส่งรายงานการเจาะสำรวจสภาพชั้นดิน อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน รพ. พระนครศรีอยุธยา	รพ.พระนครศรีอยุธยา	พระนครศรีอยุธยา	คุณคงกฤษ คุณพรกฤษณ์	-	-	-	กำลังดำเนินการ
11.3 งานมณฑลศิลป์ (ไม่มีงานคงค้าง)											
12. พิจารณาค่า K (ไม่มีงานคงค้าง)											
13.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (ไม่มีงานคงค้าง)											
14.แต่งตั้งคณะกรรมการ (ไม่มีงานคงค้าง)											
15.ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา (ไม่มีงานคงค้าง)											
16.หนังสือเวียน / อื่นๆ											
1	นบ 0033.2/10869	477	09 ส.ค. 66	ขอรับหนังสือรับรองการรับน้ำหนักของลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์ อาคารศูนย์การแพทย์ 18 ชั้น	รพ.พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	คุณพรกฤษณ์ คุณคงกฤษ	-	-	-	กำลังดำเนินการ

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๑๔	๕	๙	๙	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๐	๐	๐	๓	๑	๒	๒	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๓	๐	๓	๕	๒	๓	๖	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๐	๒	๐	๐	๐	๒	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๒	๐	๒	๒	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๙	ตรวจการจ้าง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑	๑	๐	๒	๒	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานสิ่งแวดล้อมฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบอาคารฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๔	๔	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๒๙	๒๙	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๔๒	๔๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๘๖	๘๑	๕	๓๒	๑๔	๑๘	๒๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน 24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 5

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 9 งาน)											
1	สธ 0614/00915	285	2 พค. 65	สำรวจหลังคา อาคารอำนวยการศูนย์ฯ	ศ.วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ 5	สมุทรสงคราม	ทัศนภรณ์ เอกภพ		70%		สำรวจแล้วรอรงาน โครงสร้าง+ราคา
2	รบ 0033.1/7182	610	23 สค. 65	จัดทำ Master Plan	รพ ราชบุรี	ราชบุรี	สุทธิพร				
3	รบ 0033.2/02/2436	486	8 กค. 65	งานออกแบบอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนภรณ์		40%		นำเข้าโครงการ ออกแบบใหม่ปี 2566
4	ปข 0033.305/0624	93	2 กพ. 66	สำรวจพื้นที่อาคารผู้ป่วยนอก	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญา				
5	กจ 0033.001/328	128	13 กพ. 66	สำรวจและออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก	รพ เลาช่วญ	กาญจนบุรี	สุทธิพร ทัศนภรณ์				
6	ปข 0033.301/706	323	8 พค. 66	สำรวจออกแบบปรับปรุงทางเดินเชื่อม	รพ ปราณบุรี	เพชรบุรี	อภิญา				
7	ปข 0033.305/3454	343	18 พค. 66	สำรวจออกแบบอาคารผู้ป่วย 7 ชั้น	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญา				
8	สค 0133/5414	359	26 พค. 66	ทบทวนผังแม่บทด้านอาคารสถานที่	สสจ. สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	อภิญา				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
9	สธ 0832.101/636	422	16 มิย. 66	จัดรูปแบบพื้นถนน ลานจอดรถ	รพ ยูวประสาทฯ	สมุทรปราการ	กุลนันท์				
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 2 งาน)											
1	สธ 0706.04/5676	880	7 ธค. 65	ทบทวนแบบตรวจประเมินมาตรฐาน คุณภาพ	สถานพยาบาล ประกอบโรคศิลปะ	นนทบุรี	สุทธิพร				
2	พบ 0033.301/461	172	1 มีค. 66	แบบปรับปรุงห้องผู้ป่วยอุบัติเหตุและนิติเวช	รพ ชะอำ	เพชรบุรี	อภิญา				
3											
3. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 6 งาน)											
1	นฐ 0033.8/511	246	27 มีค. 66	ขอแบบอาคารผู้ป่วยใน	รพ พุทธมณฑล	นครปฐม	ทัศนภรณ์				มีการปรับแบบ
2	นฐ 0033.6/1036	404	13 มิย. 66	ขอแบบอาคารพักคนงาน แบบ 8057	รพ ดอนตูม	นครปฐม	ทัศนภรณ์				
3	สค 0133/7048	462	6 กค. 66	ขอแบบอาคารสนับสนุน	รพ สมุทรสาคร	สมุทรสาคร	อภิญา				
4	นฐ 0033.103.3/7730	563	11 สค. 66	ขอแบบ	รพ นครปฐม	นครปฐม	ทัศนภรณ์				
5	ปข 0033.203/5965	569	16 สค. 66	ขอแบบอาคารพักเจ้าหน้าที่	รพ บางสะพาน	ประจวบฯ	อภิญา				

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
6	พบ 0033.301/1181	570	16 สค. 66	ขอแบบ	รพ ท่าช้าง	เพชรบุรี	อภิญญา				
4. ตรวจรับรองแบบ (มีงานค้าง 2 งาน)											
1	รพ 0033.2/02/3366	541	3 สค. 66	ตรวจสอบแบบอาคารคลินิกพิเศษ	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนักรณ				
2	รพ 0033.2/3365	542	3 สค. 66	ตรวจสอบแบบระบบทางเดินหายใจ	รพ โพธาราม	ราชบุรี	ทัศนักรณ				
5. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม) (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา (มีงานค้าง 2 งาน)											
1	สค 0133/7109	461	6 กค. 66	ขอแบบอาคารสนับสนุน	รพ สมุทรสาคร	สมุทรสาคร					
2	สค 0133/7108	464	6 กค. 66	ขอแบบอาคารสนับสนุน	รพ สมุทรสาคร	สมุทรสาคร					
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
8. ตรวจเช็คผัง (มีงานค้าง 1 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1	พบ 0033.301/723	302	19 เมย. 66	ตรวจสอบเพื่อปรับผัง	รพ บ้านแหลม	เพชรบุรี	อภิญญา				
9. ตรวจการจ้าง (มีงานค้าง 0 งาน)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	นฐ 0033.101.4/1837	516	19 กค. 66	ตรวจสอบอาคาร	รพ นครปฐม	นครปฐม					
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											
2											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา					(มีงานค้าง 0 งาน)						
1											
11.3 งานระบบไฟฟ้า					(มีงานค้าง 0 งาน)						

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
1											
11.4 งานระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.5 งานระบบประกอบอาคารและสภาพแวดล้อมฯ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
2											
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะ แล้ว	หมายเหตุ
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

|

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ตารางติดตามงานกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 5

เขตสุขภาพที่	ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	สถานะ						กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					งานสถาปัตยกรรม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ (MEP)	งานครุภัณฑ์	ประมาณราคา	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน		
5		งานออกแบบใหม่										
	1	อาคารอุบัติเหตุ 11 ชั้น โรงพยาบาลโพธาราม จังหวัดราชบุรี	11201	✓	80%	40%	30%	30%	0%	0%	กันยายน 2566	



1 รูปแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อ สิงหาคม 2566



2 รูปแสดงความก้าวหน้าการดำเนินงาน เมื่อ สิงหาคม 2566

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนวันที่ ๒๔ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้าง สะสม รวมไป เดือน หน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่อง ค้าง (๓)=(๑) -(๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔) -(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๑๒	๑๐	๒	๑๓	๘	๕	๗	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๐	๒	๕	๒	๓	๕	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๐	๑	๖	๔	๒	๓	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๔	๑	๓	๓	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๕	๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๔ งานระบบบำบัดน้ำเสียฯ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๕ งานระบบประกอบอาคารฯ	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑปศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๒	๑	๑	๑	๑	๐	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๒๒	๒๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๔๘	๔๘	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๐๙	๑๐๓	๖	๓๐	๑๗	๑๓	๑๙	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนวันที่ 24 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2566

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 6

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำการ	ผลการดำเนินงาน (%)	คิดว่า จะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (มีงานค้าง 7 งาน)											
1	ปจ 0033.001/0164	107	30 มค. 66	ออกแบบอาคารศูนย์อาหาร	สสจ.ปราจีนบุรี	ปราจีนบุรี	สุภาพร				
2	สธ 0205.06/4468	220	2 มีค. 66	งานออกแบบอาคาร	สำนักงานปลัด สธ.		สุภาพร				
3	สธ 0205.06/ว97	299	30 มีค. 66	สำรวจอาคารรพ.เพื่อปรับปรุงลานจอดรถเฮลิคอปเตอร์	สำนักตรวจราชการสธ.		อับดุลกอเดส				
4	สก 0033.301.08/672	396	9 พค. 66	สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมวางผัง	รพ โคกสูง	สระแก้ว	สุภาพร				
5	สธ 0315.1/2126	566	10 กพ. 66	สำรวจงานปรับปรุงหอพักพยาบาล	รพ มะเร็งชลบุรี	ชลบุรี	สุภาพร				
6	สธ 1103.29/855	651	27 กค. 66	สำรวจปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักพยาบาล	วพบ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
7	ชบ 0033.3/1990	679	14 สค. 66	สำรวจออกแบบ	รพ เกาะสีชัง	ชลบุรี	สุภาพร				
8											
9											
10											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (มีงานค้าง 5 งาน)											
1	ฉช 0033.101/13996	566	4 กค. 65	ปรับแบบอาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	ไกรสุรย์				
2	ฉช 0033.101/4623	203	27 มีค. 66	ปรับแบบเลขที่ 10309	รพ พุทธโสธร	ฉะเชิงเทรา	สุภาพร				
3	ปจ 0033.201/4/4799	467	8 มิย. 66	ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก	รพ กบินทร์บุรี	ปราจีนบุรี	สุภาพร				
4	สธ 1103.29/857	650	27 กค. 66	ปรับปรุงซ่อมแซมหอประชุม	วพบ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
5	สก 0033.203.3/4658	720	24 สค. 66	งานออกแบบและรายการประกอบแบบ	รพร สระแก้ว	สระแก้ว	สุภาพร				
3. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ (มีงานค้าง 3 งาน)											
1	ฉช 0033.3/1948	557	4 กค. 65	ขอแบบ เลขที่ 8057 + ก.49/เมย./61	รพ พนมสารคาม	ฉะเชิงเทรา	สป 0033.303				ดำเนินการ โครงสร้าง
2	จบ 0033.1/12688	522	21 มิย. 66	ขอแบบรูปอาคารผู้ป่วยใน	รพ พระปกเกล้า	จันทบุรี	สุภาพร				
3	ชบ 0033.3/3464	562	7 กค. 66	ขอแบบรูปบ้านพักข้าราชการ อำเภวยการฯ	รพ แหลมฉบัง	ชลบุรี	สุภาพร				
4											
5											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
4. ตรวจสอบแบบ						(มีงานค้าง 3 งาน)					
1	ชบ 0033.301/1831	439	25 พค. 66	ตรวจสอบผังอาคารผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง	รพ พานทอง	ชลบุรี	อับดุลกอเดส สุภาพร				
๒	สก 0033.001.3/3164	581	13 กค. 66	ตรวจสอบแบบอาคารแพทย์แผนไทย	รพ โคกสูง	สระแก้ว	สุภาพร				
๓	ชบ 0033.3/8852	595	18 กค. 66	ตรวจสอบแบบอาคารเสริมสุขภาพ โภชนาการ	รพ บางละมุง	ชลบุรี	สุภาพร				
๔											
๕. ทำเอกสารรายการประกอบแบบ (ใบชี้ที่เดิม)						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
6. ประมาณราคา/ตรงจสอบราคา						(มีงานค้าง 0 งาน)					
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											
8. ตรวจสอบเช็คผัง						(มีงานค้าง 0 งาน)					
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
9. ตรวจการจ้าง								(มีงานค้าง 0 งาน)			
10. ตรวจสอบระบบอาคาร								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
11. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
11.4 งานระบบสุขาภิบาล								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											
11.5 งานระบบเครื่องกล								(มีงานค้าง 0 งาน)			
1											

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำการ	ผลการ ดำเนิน งาน (%)	คิดว่า จะแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
11.6 งานมณฑนศิลป์ (มีงานค้าง 0 งาน)											
1											
12. พิจารณาค่า k (มีงานค้าง 1 งาน)											
1	สก 0033.201.2/4569	697	21 สค 66	ค่าเค อาคารจอดรถ	รพร สระแก้ว	สระแก้ว					
13. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน (มีงานค้าง 0 งาน)											
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดราคา (มีงานค้าง 0 งาน)											
15. อื่นๆ (มีงานค้าง 0 งาน)											

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ ก.ค.๖๖ ถึง ๒๘ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ				๒		๒	๒	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๑		๑		๑	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ								
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๑	๑						
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๑	๑						
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
๑๑	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๕	๕	๐				๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒						
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง	๑	๑	๐				๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๓	๓	๐				๐	
๑๕	ประชุม	๑๕	๑๕						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๓๐	๓๐						
	รวม	๖๑	๖๑	๐	๓	๐	๓	๓	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ ก.ค.๖๖ ถึง ๒๘ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๗

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง ๒ เรื่อง)										
๑	มค๐๐๓๓.๓๐๑/๐๔/๒๑๕๐	๒๖๐	๖ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจออกแบบ Master Plan	รพ.กุตรัง	มหาสารคาม	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒	ขก ๐๐๓๓.๓๑๒.๐๑/ว.๑๗	๓๑๘	๕ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจออกแบบ และ ประเมินราคา	รพ.เวียงน้อย	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (คงค้าง ๑ เรื่อง)										
๑	ขก๐๐๓๓.๓๑๐/๙๙๑	๒๕๙	๑ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบปรับปรุง ห้องผ่าตัด อาคารผู้ป่วยนอก ๓ ชั้น	รพ.พล	ขอนแก่น	ชาติศักดิ์กรินทร์	-	-	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๔. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม) (ไม่มีงานคงค้าง)										
๖. ประเมินราคา/ตรวจสอบราคา (ไม่มีงานคงค้าง)										
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (ไม่มีงานคงค้าง)										
๘. ตรวจเช็คผัง (ไม่มีงานคงค้าง)										
๙. ตรวจการจ้าง (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม (ไม่มีงานคงค้าง)										
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา (ไม่มีงานคงค้าง)										

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน/สำเนาสัญญาจ้าง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ(หนังสือเวียน)							(ไม่มีงานคงค้าง)			

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



ตารางติดตามงานกลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ 7

เขตสุขภาพที่	ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	สถานะ						กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
					งานสถาปัตยกรรม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ (MEP)	งานครุภัณฑ์	ประมาณราคา	แบ่งงวดงาน-งวดเงิน		
7		งานออกแบบใหม่										
	1	อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ชั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์	836601	✓	100%	90%	80%	100%	50%	0%	กรกฎาคม 2566	○ ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.6) - บาท ○ ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน ○ งวดงาน-งวดเงิน - งวด
	2	อาคารเฝ้าฯ 4 ชั้น โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น	816601	✓	100%	80%	70%	100%	20%	0%	สิงหาคม 2566	○ ราคาค่าก่อสร้าง (ปร.6) - บาท ○ ระยะเวลาก่อสร้าง - วัน ○ งวดงาน-งวดเงิน - งวด

รายงาน ณ วันที่ 29 ส.ค. 66

① อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 5 ชั้น



② อาคารเฝ้าฯ 4 ชั้น



กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้างเขตที่ 7 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ



กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้างเขตที่ 7
เลขที่รับ 56
วันที่ 02 ก.พ. 2566
เวลา 13.21



กองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 994
วันที่รับ 01 ก.พ. 2566
เวลารับ 09.30

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เลขที่รับ 1140
วันที่รับ 31 ส.ค. 2566
เวลารับ 19:10

ที่ สธ ๐๒๐๕.๐๗/๓๔

สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ผ่านผู้อำนวยการกองแบบแผน)

อ้างถึง หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ สธ ๐๗๐๓.๑๐/๘ ลงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำขอรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้นำส่งแบบฟอร์มคำขอรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยให้เขตสุขภาพจัดส่งข้อมูลรายการสิ่งก่อสร้างที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำขอของบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คัดค้าน หมายความว่าพื้นที่และระดับศักยภาพของการให้บริการของหน่วยงาน นั้น

ในการนี้ สำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๗ จึงขอส่งข้อมูลขอรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ เพื่อประกอบคำของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดดังนี้

๑. ยื่นขออนุมัติรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้
 - ๑.๑ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ หลัง
 - ๑.๒ อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๑ หลัง
๒. ขออนุมัติรับการสนับสนุนงานออกแบบใหม่เพิ่มเติม จำนวน ๑ รายการ ดังนี้
 - ๒.๑ ระบบบำบัดน้ำเสียแอสแบบคูวนเวียน (Oxidation Ditch : OD) โรงพยาบาลสมเด็จพระ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ระบบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

มีน ผู้อำนวยการกองแบบแผน
เพื่อไปตรวจ
เพื่อไปพิจารณาสั่งการ
1 ก.พ. 66

ขอแสดงความนับถือ

Dr. Sir

(นายธนรักษ์ ผลิพัฒน์)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง

มอบ
☒ กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ 7
☐ กลุ่มระบบประกอบอาคาร
☐ กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม
☐ กลุ่มพัฒนางานความรู้และนวัตกรรม
☐ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
☐ กลุ่มบริหารภายใน
☐ กลุ่มแผนงานและประเมินผล

เรียน
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐ เพื่อโปรดพิจารณา
☐ เพื่อโปรดดำเนินการ
☐

สำนักงานเขตสุขภาพที่ ๗
กลุ่มงานบริหารการเงินการคลัง
โทร. ๐ ๔๒๒๓ ๔๖๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ ๗ กองแบบแผน โทร. ๐๔๒๒๓๔๕

ที่ สธ ๐๗๐๓.๐๐๗/๖๕

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอนำส่งรายงานออกแบบเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ผู้อำนวยการกองแบบแผน

ตามที่ประชุมกองแบบแผน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การกำหนดรายการงานออกแบบเป้าหมาย เขตสุขภาพที่ ๑-๑๒ สำหรับประกอบคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น ได้ขอให้กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ ๑-๑๒ คัดเลือกรายการงานออกแบบเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (สำหรับประกอบคำของบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) ได้แก่ รายการงานออกแบบอาคาร จำนวนไม่เกิน ๓ รายการ/เขต และรายการออกแบบงานระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวนไม่เกิน ๑ รายการ/เขต โดยให้คัดเลือกตามเกณฑ์/ข้อกำหนดการพิจารณา ๔ ข้อ (ตามมติที่ประชุมกองแบบแผน ธันวาคม ๒๕๖๕) ตามลำดับดังนี้

๑. นโยบายบริหาร
๒. ลำดับวัน/เดือน/ปี หรือ ลำดับที่หนังสือมาส่ง-ลงรับ ภายในช่วงเวลาที่กำหนด (วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖)
๓. ประเภทอาคาร : ความสำคัญ/ความซับซ้อนของการใช้สอยตามประเภทอาคาร ได้แก่ อาคารผู้ป่วยนอก อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารวินิจฉัยและบำบัดรักษา อาคารผู้ป่วยใน อาคารสนับสนุนบริการ อาคารบริการร่วมการใช้สอย อาคารพักอาศัย อาคารสำนักงาน เป็นต้น
๔. ขนาด/พื้นที่อาคาร ได้แก่ อาคารเล็ก/กลาง/ใหญ่ อาคารพื้นที่น้อย/ปานกลาง/มาก เป็นต้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ กลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ ๗ ขอนำส่งรายงานออกแบบเป้าหมาย ดังนี้

- ก. รายการงานออกแบบอาคาร จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ ๑) อาคารสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ๒) อาคารเภสัชกรรม โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
- ข. รายการงานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ รายการ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระ จังหวัดกาฬสินธุ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

Dr. Sir

(นายชาติศิริกิตติ์ พาหุกุล)

สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มออกแบบและทำการก่อสร้าง เขตที่ ๗

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ ก.ค.๖๖ ถึง ๒๘ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสมรวมไปเดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่องออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)-(๒)	ค้างสะสมเดือนก่อน (๔)	ค้างสะสมแล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือค้างสะสม (๖)=(๔)-(๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๓	๓	๐	๑	๑	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๒	๐				๐	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ								
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๑						
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								
๘	ตรวจเช็คผัง								
๙	ตรวจการจ้าง/ตรวจรับพัสดุ	๔	๔						
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร								
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๙	๕	๔				๔	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๔	๔	๐					
	๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า								
	๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล								
	๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล								
	๑๑.๖ งานมณฑนศิลป์								
๑๒	พิจารณาค่า k								
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓						
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ	๒	๒	๐				๐	
๑๕	ประชุม	๑๐	๑๐						
๑๖	อื่นๆ (หนังสือเวียน)	๒๙	๒๙						
	รวม	๖๗	๖๓	๔	๑	๑	๐	๔	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน สรุปเดือน ๒๕ ก.ค.๖๖ ถึง ๒๘ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๘										
ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๒. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๓. ปรีक्षाแบบ/ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๔. ตรวจสอบแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจสอบเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบการจ้าง/ตรวจสอบรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑. ตรวจสอบพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม							(คงค้าง ๔เรื่อง)			
๑	สธ ๐๔๒๕.๑๐.๔/๒๓๔๔	๔๓๓	๒๔ ส.ค. ๖๖	พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการ ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์สี อาคารศูนย์ ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	สนง.ป้องกันควบคุม โรคที่ ๘ จ.อุดรธานี	อุดรธานี	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	สธ ๐๔๒๕.๑๐.๔/๒๓๔๕	๔๓๔	๒๔ ส.ค. ๖๖	พิจารณาตรวจสอบรายละเอียดการ ขออนุมัติใช้ผลิตภัณฑ์วัสดุงาน ประตู่-หน้าต่างอลูมิเนียม อาคาร ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน	สนง.ป้องกันควบคุม โรคที่ ๘ จ.อุดรธานี	อุดรธานี	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๓	นค ๐๐๓๓.๐๐๑/๓/๓๔๒๐	๔๓๕	๒๕ ส.ค. ๖๖	พิจารณาใช้งานกำจัดปลวก หอ ผู้ป่วยใน ๕ ชั้น	รพ.โพธิพิสัย	หนองคาย	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๔	สธ ๐๘๓๕.๒๗/๑๕๗	๔๓๖	๒๕ ส.ค. ๖๖	พิจารณาใช้แผ่น COMPACT LAMINATE อาคารผู้ป่วยนอก ๕ ชั้น	รพ.จิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์	ขอนแก่น	ธนเศรษฐ์	ไม่เกิน๕ วันทำ การ	-	อยู่ใน ระหว่าง ดำเนินการ พิจารณา
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.๖ งานมณฑนศิลป์							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. พิจารณาค่า k							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วันเดือนปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำ การ	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา/ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๑ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้างสะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๓	๑	๒	๒	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๒	๐	๖	๒	๔	๔	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๑๙	๑๙	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑๒	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๒๑	๒๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๔๐	๔๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๐๒	๑๐๒	๐	๙	๓	๐	๖	

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๙

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ (คงค้าง ๒ เรื่อง)										
๑	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๓๕๒๕๘	๔๐๑	๗ ต.ค. ๖๕	ออกแบบอาคารสนับสนุนบริการ ๑๑ ชั้น งบ ๖๗ (โดยประสนคุณบดินทร์ไว้เบื้องต้น)	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	ปรับแบบร่าง
๒	นม ๐๐๓๓.๐๐๑.๔/๔๘๙๒	๑๓๐	๑๕ พ.ค. ๖๖	สำรวจเพื่อจัดทำ Master plan รพ.มกุฏศิรีวัน	รพ.มกุฏศิรีวัน	นครราชสีมา	นายบดินทร์	-	-	อยู่ระหว่าง ประสานขอเข้า สำรวจ
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๔ เรื่อง)					
๑	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๔๔๔๔๔	๕๑๓	๗ ธ.ค. ๖๕	ขอจัดทำแบบแปลน บัญชีแสดงปริมาณงาน และราคาค่าก่อสร้าง อาคารจอดรถ	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๒	สธ ๐๘๑๖.๑/๔๒	๓๖	๒ ก.พ. ๖๖	ขอเปลี่ยนแปลงแบบร่างโครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙	ศูนย์สุขภาพจิตที่ ๙ นครราชสีมา	นครราชสีมา	ศิริณยา	-	-	ประสานระบบ+โครงสร้าง
๓	สธ ๐๙๑๙.๐๑/๑๓๖๓	๑๑๙	๑ พ.ค. ๖๖	ตรวจสอบงานปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก รพ. ส่งเสริมสุขภาพศูนย์อนามัยที่ ๙ นครราชสีมา	ศูนย์อนามัยที่ ๙	นครราชสีมา	ธนาเวช/ อภิชาติ/ศิริ ณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	นม ๐๐๓๓.๑๐๑.๙/๒๙๗๕๙	๓๐๗	๑๘ ก.ค. ๖๖	สำรวจพื้นที่เพื่อปรับปรุงต่อเติมอาคารฉายรังสี ต่อเติมเป็นห้องให้ยาเคมีบำบัดแบบผู้ป่วยนอก	รพ.มหาราชนครราชสีมา	นครราชสีมา	บดินทร์/ศิริ ณยา	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										
๔. ตรวจรับรองแบบ (ไม่มีงานคงค้าง)										

ลำดับที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๗. ตรวจเช็คผัง							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๑ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือนก่อน (๔)	ค้างสะสม แล้วเสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้างสะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๑	๑	๐	๐	
๒	งานออกแบบซ่อมแซม/เขียนแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวด งาน-งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ			๐					
	๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๐.๖ งานมณฑนศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	พิจารณาค่า k	๒	๒	๐	๑	๑	๐	๐	
๑๒	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งคณะกรรมการ	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	ประชุม	๑๐	๑๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	อื่นๆ	๒๓	๒๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๗	๔๖	๑	๒	๒	๐	๑	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ๒๑ กรกฎาคม - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบปรับปรุง/ซ่อมแซม					(คงค้าง ๑ เรื่อง)					
๑	ศก ๐๐๓๓.๐๐๑/๔๘๔๙	๓๐๐	๒๒ ส.ค. ๖๖	ปรับปรุงแก้ไขแบบแปลนก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง ๑๑๐๐๘	รพ.สต.โคกจาน	ศรีสะเกษ	บดินทร์	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจรับรองแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา/งวดงาน-งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจการจ้าง / ตรวจรับพัสดุ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๐.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๓ งานระบบไฟฟ้า					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐.๔ งานระบบสุขาภิบาล					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วัน ทำการ	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
๑๐.๕ งานระบบเครื่องกล							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๑.พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๒. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๓.แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๔.แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๕.หนังสือเวียน							(ไม่มีงานคงค้าง)			
๑๖. อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)			

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๒	๑	๑	๒	๐	๐	๓	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๖	๖	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๒	๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๓๔	๓๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๘	๔๗	๑	๔	๐	๔	๕	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	ภก ๐๐๓๓.๓/รพ.๑/๕๑๐๖	๒๗๔	๘ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแผนแม่บท ด้านอาคารและสภาพแวดล้อม	รพ.กลาง	ภูเก็ต	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๓ งาน)					
๑	สธ ๐๔๒๘.๑/๙๗๑	๒๑๓	๓ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ขอรายการ ประกอบงานก่อสร้าง บัญชีแสดง รายการก่อสร้าง ฯ อาคาร ห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ๙ ชั้น	สนง.ป้องกันและ ควบคุมโรค	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒	สธ ๐๗๒๖/๕๙๔	๓๒๙	๑๐ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลนและ รายการประกอบงานก่อสร้าง	ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๑	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์ คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	นศ ๐๐๓๓.๒/๒๘๔๙	๓๘๕	๑๖ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบแปลน และบัญชีแสดงปริมาณงาน	รพ.ลิซล	นครศรีธรรมราช	คุณสุริยพงศ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓. ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๔. ตรวจสอบแบบ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๑๑๐๓.๑๑/๔๐๘	๓๑๑๓	๓ ก.ค. ๖๖	ขอทบทวนราคาอาคารเรียนและ หอพัก	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี นครศรีธรรมราช	นครศรีธรรมราช	คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๙. ตรวจการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๖ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๑	๐	๑	๒	๐	๒	๓	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๔	๒	๒	๒	๐	๒	๔	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ/ขอแบบ	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๑	๐	๑	๐	๐	๐	๑	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๘	๘	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๒	๐	๓	๓	๐	๐	
	๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา	๑	๑	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๓	๓	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๒๒	๒๒	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๔๕	๔๑	๔	๘	๓	๕	๙	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค.๖๖										
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒										
ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(คงค้าง ๓ งาน)					
๑	พท ๐๐๓๒.๓๐๑/๓/๑๙๗๖	๕๒๐	๖ ก.ย. ๖๕	ขอรับการสนับสนุนออกแบบผังหลัก โรงพยาบาลควนขนุน	รพ.ควนขนุน	พัทลุง	คุณกุลทิรา			ประสาน รพ. แล้วรอลงพื้นที่ ภายหลัง
๒	สข ๐๐๓๓.๐๐๒/๑๗๖๘	๑๗๗	๒๒ มี.ค. ๖๖	การจัดทำ Master Plan ของ รพ.จะ นะ	สสจ.สงขลา	สงขลา	คุณกุลทิรา			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๓	สข ๐๐๓๓.๐๐๑.๓/๔๒๐๔	๔๒๔	๑๑ ส.ค. ๖๖	จัดทำ Master Plan	สสจ.สงขลา	สงขลา	คุณฐาปณีย์			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๔ งาน)					
๑	สธ ๐๖๑๓/๐๖๐๑	๙๑	๘ ก.พ. ๖๖	ส่งคำขอรับการสนับสนุนงาน ออกแบบใหม่	ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่ ๑๒ สงขลา	สงขลา	คุณกุลทิรา			รอสถาปนิกสรุป แบบเบื้องต้น / ลงพื้นที่แล้ว

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๒	ยถ ๐๐๓๓.๓/๑๐๓๐	๓๔๔	๕ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบก่อสร้าง และแบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา	รพ.รามัน	ยะลา	คุณอนุพันธ์ คุณไณทัย คุณนราศัคดี			งานราราคา (งาน สถาปัตยกรรมส่งเรื่อง ให้ทาง รพ.แล้ว / ราคาตามหลัง)
๓	ยถ ๐๐๓๓.๗๐๑/๗๖๖	๔๑๒	๑๐ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์แบบแปลน ก่อสร้างอาคารพักขยะ (ขนาดเล็ก)	รพ.กาบัง	ยะลา	คุณอนุพันธ์			อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	ตง ๐๐๓๓.๑๐๑/๘๗๗๗	๔๒๐	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขออนุเคราะห์แบบก่อสร้างอาคาร รังสีรักษา	รพ.ตรัง	ตรัง	คุณขจรศักดิ์			อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓. ปรีกษาแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๐๖/๑๓๗๙	๖๕๓	๓ พ.ย. ๖๕	ขอรับแบบแปลนก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (๑๐๙๔๒)	รพ.สต.ท่งพระ	สงขลา	คุณกุลทิรา คุณมังกร			กุลทิรา แจ้ง ดำเนินการส่งต่องาน ระบบ คุณสุทัศนุติ ชานนท์ คุณ ศุภรดา(คุณสรค์แจ้ง รายชื่อผู้ดำเนินการ)
๔. ตรวจรับรองแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สข ๐๐๓๓.๓๐๑/๑๓/๘๓๑	๓๙๒	๒๑ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบแบบ ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่องกล้อง ทางเดินอาหาร	รพ.นาหม่อม	สงขลา	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม)								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๘. ตรวจเช็คผัง								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๙. ตรวจการจ้าง								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๑. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๑.๖ งานมณฑลศิลป์								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๒. พิจารณาค่า k								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๕. ประชุม								(ไม่มีงานคงค้าง)		
๑๖. อื่นๆ								(ไม่มีงานคงค้าง)		

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค. ๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (๓)+(๖)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (๑)	เรื่อง ออก (๒)	เรื่องค้าง (๓)=(๑)- (๒)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (๔)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (๕)	คงเหลือ ค้าง สะสม (๖)=(๔)- (๕)		
๑	งานสำรวจ/วางผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๒	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	๖	๔	๒	๑๖	๒	๑๔	๑๖	
๓	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	๑	๑	๐	๑	๐	๑	๑	
๔	ตรวจรับรองแบบ	๒	๐	๒	๓	๐	๓	๕	
๕	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่ได้)	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๖	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๗	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๘	ตรวจเช็คผัง	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๙	ตรวจการจ้าง	๕๕	๕๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๐	ตรวจสอบระบบอาคาร	๐	๐	๐	๑	๐	๑	๑	
๑๑	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/ว	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม	๑๓	๑๓	๐	๐	๐	๐	๐	
	๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา	๒	๑	๑	๖	๖	๐	๑	
	๑๑.๓ งานมณฑลศิลป์	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๒	พิจารณาค่า k	๑	๑	๐	๓	๒	๑	๑	
๑๓	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	๑๒	๑๒	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๔	แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะกรรมการกำหนด	๗	๗	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๕	ประชุม	๓๕	๓๕	๐	๐	๐	๐	๐	
๑๖	อื่นๆ	๔๔	๔๔	๐	๐	๐	๐	๐	
	รวม	๑๗๘	๑๗๓	๕	๓๐	๑๐	๒๐	๒๕	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (ปี๒๕๖๖) ๒๑ ก.ค. - ๒๐ ส.ค.๖๖

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑. งานสำรวจ/วางผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๒. งานออกแบบ/ออกรายการซ่อมแซม/เขียนแบบ					(คงค้าง ๑๖ งาน)					
๑	สพฉ ๐๑/๐๐๑๐๕	๙๑	๑๗ ม.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ออกแบบและ ประมาณราคากลางการจัดจ้าง ปรับปรุงพื้นที่ลานจอดรถจักรยานยนต์	สถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๓๐๙/๗๑	๙๕	๑๘ ม.ค. ๖๖	ขอสำรวจ ตรวจสอบ ออกแบบและ ประมาณราคาการปรับปรุงพื้นที่และ รั้วโดยรอบอาคารสนับสนุนบริการ ๒๘ ชั้น	รพ.เลิดสิน	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓	สธ ๐๒๐๑.๐๔/๒๕๙	๑๔๒	๒๔ ม.ค. ๖๖	ขอสำรวจ ออกแบบและประเมิน ราคาการปรับปรุงห้องปฏิบัติงาน กองกลาง อาคาร ๓ ชั้น ๒ ตึก สป.	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๒๖๔	๒๙๗	๑๗ ก.พ. ๖๖	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร โภชนาการ	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณปิยปวีณ์			ส่งแบบให้งานโยธา เพื่อประมาณราคา แล้ว

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๕	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๒๗๗	๓๐๘	๒๑ ก.พ. ๖๖	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคารพัก เจ้าหน้าที่ (อาคารพักพยาบาล ขนาด ๒๐ ห้อง)	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณไชยพัฒน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๖	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๒๖๕	๔๑๒	๙ มี.ค. ๖๖	ขอสำรวจและออกแบบพร้อม ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร จำนวน ๒ หลัง อาคารสันตนาการ และ อาคารโรงงานอาชีวบำบัด	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๗	สธ ๐๖๐๑.๐๘/๑๙๑๕	๖๓๕	#####	ติดตามความก้าวหน้าการ สำรวจ ออกแบบ กำหนดวงดงานวงดเงิน และประมาณราคากลาง งานทำ หลังคาคลุมตลาดฟ้า อาคาร ๘	กรมวิทยาศาสตร์การแพ ทย์ สำนักงาน เลขานุการกรม	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๘	สธ ๐๓๑๕/๑๒๗๒	๘๒๔	๓๑ พ.ค. ๖๖	ขอสนับสนุนบุคลากรร่วมสำรวจ ออกแบบพร้อมประมาณราคา ปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลุ่มงาน พยาธิวิทยากายวิภาค	สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๙	สธ ๐๑๐๐.๑/๒๒๓๐	๘๘๑	๑๒ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบรูป รายการและประมาณราคากลางงาน ปรับปรุงพื้นอาคารำสนักงานรัฐมนตรี	สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๐	สธ ๕๓๐๑/๖๘๒	๙๕๐	๒๒ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์บุคลากร งาน พัฒนาปรับปรุงพื้นที่บริเวณ ชั้น ๑ สำรวจและออกแบบ	สำนักงานฉาปนกิจ ฯ กระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑	สธ ๐๕๑๐/๓๑๔๑	๙๙๘	๒๗ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบ ออกแบบ และประมาณการค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร สำนักงานของโรงพยาบาลการแพทย์ แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน	กรมการแพทย์แผนไทย ฯ โรงพยาบาล การแพทย์แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๒	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๙๔๐	๑๐๘๐	๑๑ ก.ค. ๖๖	ขอแจ้งยืนยันการสำรวจและ ออกแบบพร้อมประมาณราคางาน ปรับปรุงอาคารดรุณพัฒนา	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๓	สธ ๐๘๒๒.๑๐๓/๙๕๓	๑๑๐๗	๑๓ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและ ออกแบบพร้อมประมาณราคา	สถาบันราชานุกูล	กรุงเทพฯ	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๔	สธ ๐๒๐๑.๐๔/๒๔๙๖	๑๑๒๗	๑๗ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ออกแบบ และประเมินราคาการซ่อมแซมพื้น ลาดฟ้า อาคาร ๑๐๐ ปีการ สาธารณสุขไทย	กองกลาง สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณพิมพ์ชนก			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๕	สธ ๐๓๒๑/๕๐๖๖	๑๑๙๗	๒๗ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์สำรวจโครงสร้าง ทางเชื่อม ชั้น ๒ และ ๓ ระหว่าง อาคารมหิตลาธิเบศรฯ	สถาบันสุขภาพเด็ก แห่งชาติมหิตลาธิเบศรฯ	กรุงเทพฯ	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๖	สธ ๐๓๑๒/๒๗๘๕	๑๒๖๙	๑๑ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่จัดทำป้ายสถาบัน	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด แห่งชาติฯ กรมการ แพทย์	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๓. ปริक्षाแบบ/ค้นหาแบบ					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ (ค.ตร.)๐๕๐๑.๐๕/๑๗๗	๕๔๙	๓๑ มี.ค. ๖๖	พิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ แบบขยายโครงสร้างเสาระเบียง แบบขยายพื้น S๓ และแบบก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม	คณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ กรมการแพทย์ แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจิระศักดิ์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔. ตรวจรับรองแบบ					(คงค้าง ๕ งาน)					
๑	สธ ๐๓๑๒/๑๕๔๗	๗๒๗	๑๑ พ.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง แบบก่อสร้าง รายการ ประกอบแบบ และรายการประมาณ ราคาค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลอง	สถาบันบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ ฯ กรมการแพทย์	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๒	สธ ๐๙๐๑.๐๕/๑๙๗๖	๙๐๐	๑๖ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบโครงการปรับปรุงสถาน อเนกประสงค์ และโครงการทาสี อาคาร ๑ อาคาร ๒ อาคาร ๕ ของ กรมอนามัย	สำนักงานเลขานุการ กรม กลุ่มอาคารและ สถานที่ กรมอนามัย	นนทบุรี	คุณสรพวัฒน์ คุณมังกร			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๓	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๓๘๐๘	๑๑๐๑	๑๓ ก.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการ ตรวจสอบแบบรูปและรายการคำนวณ โครงสร้างการก่อสร้างสะพานบริเวณ ทางเข้าลานและแท่นประดิษฐานพระบรม ราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า เจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า พระ บิดาแห่งการแพทย์แผนไทย	กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก สำนักงานเลขาธิการ กรม	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๔	สธ ๐๔๑๕.๑๖/๔๕๓๑	๑๒๑๙	๗ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ โครงสร้างอาคาร เพื่อรองรับน้ำหนักตู้ เก็บแฟ้มเวชระเบียน	สถาบันบำราศนราดูร	นนทบุรี	คุณนัชชา			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕	สธ ๐๕๐๑.๐๕/๔๙๙๗	๑๒๕๘	๑๐ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแก้ไขความ ชำรุดบกพร่องของงานจ้างก่อสร้าง อาคารห้องน้ำสำหรับห้องประชุม อาคาร ๒ ชั้น ๑	กรมการแพทย์แผน ไทยและการแพทย์ ทางเลือก สำนักงาน เลขาธิการกรม	นนทบุรี	คุณสืบสกุล			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๕. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๖. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๗. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๘. ตรวจเช็คผัง					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๙. ตรวจสอบการจ้าง					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๐. ตรวจสอบระบบอาคาร					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๑๑๐๔.๐๘/๙๐๗	๙๐๔	๑๖ มิ.ย. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์วิศวกรเข้า ตรวจสอบโครงสร้างอาคารและ ประเมินอาคารที่ชำรุด	วิทยาลัยเทคโนโลยีทาง การแพทย์และ สาธารณสุข กาญจนนา ภิเชก สถาบันพระบรม ราชชนก	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ										
๑๑.๑ งานสถาปัตยกรรม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๑.๒ งานวิศวกรรมโยธา					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ(ค.ตร.)๐๕๐๑.๐๕/๑๐๘๕	๑๒๙๑	๑๖ ส.ค. ๖๖	ขอความอนุเคราะห์พิจารณารายงาน ผลการเจาะสำรวจและทดสอบดิน การติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ กรมการ แพทย์แผนไทยฯ	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๑.๓ งานมัณฑนศิลป์					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๒. พิจารณาค่า k					(คงค้าง ๑ งาน)					
๑	สธ ๐๒๐๖.๐๘.๒/๑๔๓๖	๑๐๙๙	๑๓ ก.ค. ๖๖	ขอส่งรายละเอียดเพื่อพิจารณาใน งานก่อสร้างอาคารจอดรถ (ค่าk)	กองบริหารการคลัง สำนักงาน ปลัดกระทรวง สาธารณสุข	นนทบุรี	คุณจักรกริสน์			อยู่ระหว่างการ ดำเนินการ
๑๓. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๔. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา					(ไม่มีงานคงค้าง)					

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมาย งาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการสุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน ๕ วันทำการ (เฉพาะพิจารณา วัสดุ)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
๑๕. ประชุม					(ไม่มีงานคงค้าง)					
๑๖. อื่นๆ					(ไม่มีงานคงค้าง)					



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ 13

งานออกแบบในปีงบประมาณ 2566

1. แบบใหม่ 1 แบบ (ของบประมาณปี 2568)

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	สถานะ						กำหนดการแล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
				งาน สถาปัตยกรรม	งาน โครงสร้าง	งานระบบฯ	งาน ครุภัณฑ์	ประมาณราคา	แบ่งงวดงาน-งวด เงิน		
	แบบใหม่										
1	อาคารจอดรถพร้อมหน่วยบริการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 7 ชั้น กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นนทบุรี	11203	เห็นชอบ โดยรองอธิบดีฯ	99 %	95 %	99 %	95 %	85 %	-	กันยายน 2566	



รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน (24 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2566)

กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ หนังสือส่งทั้งหมด 66 ฉบับ

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			หมายเหตุ
		เรื่องเข้า (1)	เรื่องออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)-(2)	
1	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ เรื่อง ตรวจสอบสถานพยาบาล	0	0	0	
2	ประชุม	13	13	0	
3	หนังสือเวียน	20	20	0	
4	อื่นๆ	33	33	0	
	รวม	66	66	0	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
สมุดทะเบียนรับ							
๒๖๙	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๗๐๐ การประชาสัมพันธ์ข้าราชการผู้สนใจไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ณ ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑-๑๒	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๐๖:๒๕	
๒๗๐	มท ๐๗๑๐/ว๓๒๑๕ Mขอเชิญประชุม คกก.ควบคุมอาคาร ครั้งที่ ๑๕๓๓-๑๕/๒๕๖๖ วันที่ ๒๐ ก.ค. ๖๖	๑๘/๐๗/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๐๖:๒๖	
๒๗๑	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๒๙๘๓ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	๒๐/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรัชกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๐๖:๓๖	
๒๗๒	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๒๙๖๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรัชกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๐๖:๓๗	
๒๗๓	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๖๙ ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะ อนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนากำลังคน และกำหนดหลักสูตรการฝึกอบรม กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑, กองสุศึกษา, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, สำนักงานเลขานุการกรม, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มแผนงาน	พรรัชกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๑๕:๕๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๒๗๔	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๗๑ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบ คำขอรุณรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๑๕:๕๙	
๒๗๕	สธ ๐๗๑๑.๑/๒๓๐ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรครุสมาธิ รุ่นที่ ๕๐	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มงานจริยธรรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๐๒	
๒๗๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๗๐ ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรมของรัฐบาล อินเดีย หลักสูตร "Specialized Training Programme for Establishing National, Regional Telemedicine Platform for Primary Health in Resource Limited Settings	๒๑/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๐๒	
๒๗๗	สธ ๐๗๐๓.๐๐๔/๑๔๐ ขอเชิญประชุมติดตามงานออกแบบ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๐๓/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔	กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มระบบประกอบอาคาร	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๐:๑๐	
๒๗๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๒๒๔๓ ขอสงวนเอกสารการประเมินผลงานและ เชิญประชุม	๒๐/๐๖/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๐:๑๑	
๒๗๙	มท ๐๗๑๐/๖๓๓๓๐ ขอเชิญประชุม คกก.ควบคุมอาคาร ครั้ง	๒๕/๐๗/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๓:๐๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	ที่ ๑๕๓๔-๑๖/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ ก.ค.๖๖						
๒๘๐	สธ ๐๗๐๒.๐๔.๔/๒๔๗๗ ขอแจ้งคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๖๙๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๒๔/๐๗/๒๕๖๖	กองกฎหมาย	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๑๕	
๒๘๑	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๕๑๑ ขอส่งสรุปรายงานการประชุมคณะทำงาน ด้านเนื้อหาวิชาการ ครั้งที่๒/๒๕๖๖	๒๕/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กองวิศวกรรมการแพทย์, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสุขศึกษา, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กอง แบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๑๘	
๒๘๒	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๓๖๖๒ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	ผู้เข้าร่วมประชุม	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๓๒	เรียนคุณบดีนทร์เพื่อพิจารณา
๒๘๓	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๓๖๖๑ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	๑๙/๐๗/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	ผู้เข้าร่วมประชุม	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๓๓	
๒๘๔	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๐๓๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๖ เรื่อง	๒๔/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๖/๐๗/๒๕๖๖ ๑๖:๓๓	
๒๘๕	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๕๓๑ ขอเชิญหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมจัด แสดงบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการให้ บริการในการประชุมวิชาการ กรม	๒๖/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กองวิศวกรรมการแพทย์, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ๑๐:๐๑	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๔ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
	สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖						
๒๘๖	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๕๓๖ ขอเชิญเข้าร่วมจัดแสดงบูธนิทรรศการผลงานเด่นตามกลุ่มภารกิจ ในการประชุมวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๒๖/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กลุ่มตรวจสอบภายใน, สำนักงานเลขานุการกรม, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสุขศึกษา, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย, กองแบบแผน, ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองวิศวกรรมการแพทย์, กลุ่มงานจริยธรรม, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ๑๐:๐๒	
๒๘๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๖/๒๗๗๓ ขอส่งรายงานการประชุม	๒๖/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ๑๑:๑๗	
๒๘๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๘๐๑ การจัดตั้งหน่วยงานภายในกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๒๖/๐๗/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, กองแบบแผน, กลุ่มงานจริยธรรม, กองวิศวกรรมการ	พรรษกร ภูศรี	๒๗/๐๗/๒๕๖๖ ๑๑:๑๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๕ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				แพทย์, กองสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ, กองสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ			
๒๘๙	สธ ๐๒๐๗.๐๔/ว๖๗๕๘ ขอเชิญประชุมคกก.พัฒนาสถานบริการ สังกัดสป. ตามนโยบาย EMS ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันที่ ๙ ส.ค.๖๖	๒๖/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข	กองแบบแผน	พระราชกร ภูศรี	๐๗/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๒๕	
๒๙๐	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๐๘๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๒๖/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พระราชกร ภูศรี	๐๗/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๒๕	
๒๙๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๒๘๘๐ ขอส่งคำสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๐๓/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง, กลุ่มงาน จริยธรรม, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, กลุ่มงาน ทะเบียนประวัติและบำเน็จ ความชอบ, กลุ่มงานบริหารลูกจ้าง ประจำและพนักงานราชการ, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มพัฒนาระบบอัตรากำลัง, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบ	พระราชกร ภูศรี	๐๗/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๒๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๖ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				วจร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคเหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, กองสุขศึกษา, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองแบบแผน, กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร, สำนัก สื่อสารและประชาสัมพันธ์, งาน คัดเลือกและประเมินบุคคล			
๒๙๒	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๑๓๔ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๒๗/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรัชกร ภูศรี	๐๗/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๓๓	
๒๙๓	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๑๓๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๕ เรื่อง	๒๗/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรัชกร ภูศรี	๐๗/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๓๔	
๒๙๔	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๑ ขอส่งรายงานการประชุมกองแบบแผน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ และเชิญประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๐๗/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	ผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออก แบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ ๕, กลุ่มออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มออกแบบ และกำกับกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่ม ออกแบบและกำกับกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับกับการ	พรรัชกร ภูศรี	๐๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๑๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๗ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มพัฒนาระบบ บริการและวิชาชีพ, งานพัสดุและ ยานพาหนะ, กลุ่มแผนงานและ ประเมินผล, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสีย และสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและ กำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, กลุ่ม ออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขต ที่ ๑, กลุ่มออกแบบและกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ ๒, งานประสานการ ก่อสร้าง, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และ นวัตกรรม, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๙, ผู้ช่วยผู้อำนวย การกองแบบแผน, งานนโยบายพิเศษ และเทคโนโลยีสารสนเทศ, งาน สารบรรณ, งานการเงินและบัญชี, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่ม ระบบประกอบอาคาร			
๒๙๕	บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด นำเข้าผลิตภัณฑ์ Trander acoustic Product training บริษัท แทรนดาร์ อิน เตอร์เนชั่นแนล จำกัด	๐๗/๐๘/๒๕๖๖	บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	กองแบบแผน	พรชกร ภูศรี	๐๙/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๓๐	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๘ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๒๙๖	มท ๐๗๑๑.๒/ว ๑๑๓๓๓ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับประเทศ (วันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.)	๒๔/๐๗/๒๕๖๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	อธิบดี	พรรัชกร ภูศรี	๐๙/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๓๑	
๒๙๗	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๒๙๕๒ ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ ทีเอ็มจี วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๖ / กองแบบแผน	๐๘/๐๘/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๐๙/๐๘/๒๕๖๖ ๑๔:๓๔	
๒๙๘	สธ ๐๗๐๓.๐๓/๓๖๐๐ ขอแจ้งสรุปรายการขอใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับการปฏิบัติงานภายในกองแบบแผน	๐๘/๐๘/๒๕๖๖	กองแบบแผน	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๐๙/๐๘/๒๕๖๖ ๑๔:๓๖	
๒๙๙	ดศ ๐๔๐๘.๓/ว ๒๘๕๑ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) โครงการจัดทำนโยบายการวางโครงข่ายเคเบิลใยแก้วนำแสงในตัวอาคาร สำหรับอาคารสร้างใหม่ และอาคารที่ทำการบูรณะใหม่ (Fiberization in Building Policy) (วันที่ ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซ็นทารา บาย เซ็นทารา แจ้งวัฒนะ กทม.)	๒๗/๐๗/๒๕๖๖	สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	อธิบดี	พรรัชกร ภูศรี	๑๕/๐๘/๒๕๖๖ ๐๗:๕๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๙ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๐๐	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๔๘๓ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม และโครงการ "HSS Startup Project" เข้าร่วมประกวดใน งานวิชาการ กรม สบส. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ก.ย. ๒๕๖๖)	๐๙/๐๘/๒๕๖๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๑๕/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๐๐	
๓๐๑	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๒๙๓๗ ขอส่งแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหาการลงละเมิดหรือคุกคามทาง เพศในการทำงาน กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒)	๐๘/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	กองวิศวกรรมการแพทย์, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กองแบบแผน, กลุ่มตรวจสอบ ภายใน, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, สำนักงานเลขานุการกรม, กลุ่ม แผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง, กองกฎหมาย, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, กอง สุศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคใต้, กลุ่มงานจริยธรรม, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	พรรษกร ภูศรี	๑๕/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๐๐	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๐ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๐๒	มท ๐๗๑๑.๒/ว๑๑๖๙๘ ขอยกเลิกการประชุมรับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารือ และการมีส่วนร่วมของ ประชาชนต่อร่างผังนโยบายระดับ ประเทศ (ขอยกเลิกการประชุมเชิง ปฏิบัติการ ครั้งที่ ๔ และการประชุม หารือกลุ่มย่อย การวางผังนโยบายระดับ ประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐. น. ณ ห้องประชุมชาลอนเอ ชั้น ๒ โรงแรมสวิส โซเทล กรุงเทพ รัชดา กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด)	๒๗/๐๗/๒๕๖๖	กรมโยธาธิการและผังเมือง	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรัชกร ภูศรี	๑๕/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๐๑	
๓๐๓	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๕๖๔ ขอเชิญเข้าร่วมงานวิชาการกรมสนับสนุน บริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ.๒๕๖๖	๐๗/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรัชกร ภูศรี	๑๕/๐๘/๒๕๖๖ ๐๘:๐๓	
๓๐๔	อว ๗๐๐๓/๔๔๕ ขออนุญาตใช้แบบก่อสร้าง	๒๗/๐๗/๒๕๖๖	คณะสถาปัตยกรรม ศิลปะและการ ออกแบบ สถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๑๕/๐๘/๒๕๖๖ ๑๔:๒๒	
๓๐๕	สธ ๐๗๐๑.๗.๕/๑๖๒๒ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำ งานด้านเนื้อหาวิชาการ ครั้งที่๓/๒๕๖๖	๑๕/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มแผนงาน	กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสุขศึกษา, กองแบบแผน, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์, กองสถาน	พรรัชกร ภูศรี	๑๖/๐๘/๒๕๖๖ ๑๓:๐๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๑ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสุขศึกษา, กองแบบแผน, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสุขศึกษา, กองแบบแผน, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองวิศวกรรมการแพทย์, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กองสุขศึกษา, กองแบบแผน			
๓๐๖	กท ๐๖๓๕.๔/๗๖๔๗ ขอรับการอนุเคราะห์แบบมาตรฐาน ก่อสร้างโรงพยาบาล	๐๗/๐๘/๒๕๖๖	กรมช่างโยธาทหารอากาศ กองวิทยา การ	อธิบดี	พรพรกร ภูศรี	๑๖/๐๘/๒๕๖๖ ๑๒:๕๘	
๓๐๗	สธ ๐๗๐๑.๑/๗๓๒๘๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๑๑/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, กอง กฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัด	พรพรกร ภูศรี	๑๖/๐๘/๒๕๖๖ ๑๓:๐๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๒ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				นครศรีธรรมราช, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มงานจริยธรรม, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, กองวิศวกรรมการแพทย์, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, กองแบบแผน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๓ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๐๘	สธ ๐๗๑๑.๒/๒๕๐ ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก บุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการ พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๕/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มงานจริยธรรม	กองกฎหมาย, กองสุខศึกษา, กอง วิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๒, กลุ่มตรวจ สอบภายใน, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค เหนือ จังหวัดนครสวรรค์, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคเหนือ, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กองแบบแผน, กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล	พรรษกร ภูศรี	๑๖/๐๘/๒๕๖๖ ๑๔:๒๔	
๓๐๙	สธ ๐๗๑๑.๑/ว๓๓๗๙ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่องคลาย ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์)	๑๗/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค กลาง, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคใต้, กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, กองแบบแผน, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค เหนือ	พรรษกร ภูศรี	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ๑๒:๔๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๔ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๑๐	สธ ๐๗๐๖.๐๔/๓๘๘๗ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการสถาน พยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน	๐๘/๐๘/๒๕๖๖	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ	ผู้เข้าร่วมประชุม	พรรษกร ภูศรี	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ๑๒:๔๒	
๓๑๑	สธ ๐๗๑๑.๒/๒๕๖ ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖	๑๗/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มงานจริยธรรม	กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, กองสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน, กองแบบแผน, กอง วิศวกรรมการแพทย์, กองสุศึกษา	พรรษกร ภูศรี	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ๑๒:๔๓	
๓๑๒	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๓๐๖๘ ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความ คิดเห็นเกี่ยวกับ (ร่าง) แนวทางการ พัฒนาบุคลากร กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ	๑๖/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ๑๓:๔๖	
๓๑๓	พม ๐๓๐๔/ว๗๑๐๐ ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาคัดเลือกหอพักเอกชนที่ได้รับ การประกาศเกียรติคุณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (วันจันทร์ที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐-๑๔.๐๐น. ณ กรมกิจการเด็กฯ)	๑๑/๐๘/๒๕๖๖	คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือก หอพักเอกชนที่ได้รับการประกาศ เกียรติคุณ	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	พรรษกร ภูศรี	๑๘/๐๘/๒๕๖๖ ๑๖:๐๑	
๓๑๔	สธ ๐๗๐๓.๐๑๘/๒๒ แจ้งบุคลากรไม่มาปฏิบัติราชการ	๒๑/๐๘/๒๕๖๖	งานบริหารทรัพยากรบุคคล	ผู้อำนวยการกองแบบแผน	พรรษกร ภูศรี	๒๑/๐๘/๒๕๖๖ ๑๘:๓๗	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๕ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๑๕	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๑๐๐ แผนการพัฒนาศูนย์บริการรายตำแหน่ง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๘/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค กลาง จังหวัดชลบุรี, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, สำนักงานเลขานุการกรม, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์ บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กลุ่ม งานจริยธรรม, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๕, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ วงจร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, กอง กฎหมาย, กองแบบแผน, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กอง	พรรษกร ภูศรี	๒๑/๐๘/๒๕๖๖ ๑๘:๓๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๖ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				วิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๙, กองสุขศึกษา, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น			
๓๑๖	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๓๑๔๓ แนวทางการลงเวลาปฏิบัติราชการของ ข้าราชการสังกัดกองแบบแผน กรณี ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างในพื้นที่ กระทรวงสาธารณสุข	๒๔/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๑๐	
๓๑๗	สธ ๐๗๐๑.๕.๕/๓๑๖๔ การดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลการ ศึกษาของข้าราชการพลเรือนสามัญ	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค กลาง, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคใต้, กองแบบแผน, กอง กฎหมาย, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กอง	พรรัชกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๑๑	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๗ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์ บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, กลุ่มงานจริยธรรม, สำนักงาน เลขานุการกรม, กองสถานประกอบ การเพื่อสุขภาพ, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมกรมการแพทย์ครบวงจร, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กอง วิศวกรรมกรมการแพทย์, กองสุขศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค เหนือ, กองสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ, สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์, กลุ่มตรวจสอบ ภายใน, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง เหนือ			
๓๑๘	สธ ๐๗๐๑.๕.๔/๓๑๐๘ ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ	๒๑/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค เหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคใต้, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ภาคกลาง, สำนักงานเลขานุการกรม, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมกรมการแพทย์	พรชกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๑๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๘ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
				ครบวงจร, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๕, กองสุขศึกษา, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชาย แดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กลุ่ม แผนงาน, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัด นครสวรรค์, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองวิศวกรรมการ แพทย์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์ บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น, กลุ่มงานจริยธรรม, กลุ่ม ตรวจสอบภายใน, กองแบบแผน,				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๑๙ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๙, กองกฎหมาย			
๓๑๙	สธ ๐๗๐๑.๕.๒/๑๐๓๐ ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	๑๘/๐๘/๒๕๖๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองแบบแผน, รองอธิบดี (๓) , กอง สถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, กองสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคใต้, กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, รองอธิบดี (๒) , กอง สุขศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์บริการธุรกิจ สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค กลาง, เลขาธิการกรม, กลุ่มงาน จริยธรรม, กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลุ่มแผนงาน, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร, รองอธิบดี (๑) , กอง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กอง	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๑๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๐ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กฎหมาย, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กองวิศวกรรมการแพทย์			
๓๒๐	สธ ๐๗/๐๓.๐๑๘/๒๓ ขอแจ้งเลื่อนการประชุมกองฯครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (จากวันที่ ๒๘ สค ๖๖ เป็นวันที่ ๓๐ สค ๖๖)	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มบริหารงานทั่วไป	กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม, กลุ่มออกแบบและกำกับ การก่อสร้าง เขตที่ ๕, รองผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๑, ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองแบบแผน, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๒, งานนโยบายพิเศษและ เทคโนโลยีสารสนเทศ, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๙, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๓, งานประสานการก่อสร้าง, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๐, งานบริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่มแผนงานและประเมินผล, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๔, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑๓, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๖, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๒, ผู้อำนวยการกองแบบแผน, งานการเงินและบัญชี, กลุ่มออกแบบ และกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๘, กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ,	พรชกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๑๓	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๑ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๑, งานพัสดุและยานพาหนะ, กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้าง เขตที่ ๗, กลุ่มระบบประกอบอาคาร, กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม			
๓๒๑	สธ ๐๗/๐๑.๑/ว๓๔๓๐ แจ้งเวียนหนังสือราชการ	๒๑/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, พระพรหม ภูศรี กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กอง สนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์ บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง, กลุ่มงาน จริยธรรม, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, กอง สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์		๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๒๘	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๒ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค กลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๖, สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, กอง วิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์บริการ ธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองแบบแผน, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ วงจร, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, กลุ่มตรวจสอบ ภายใน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔			
๓๒๒	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๔๒๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๓ เรื่อง	๒๑/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กองสุศึกษา, กลุ่มบริหารทรัพยากร บุคคล, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กลุ่ม	พรชัยกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๒๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๓ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				พัฒนาระบบบริหาร, สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคเหนือ, กอง วิศวกรรมการแพทย์, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กอง แบบแผน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, กลุ่มแผนงาน, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, กลุ่มพัสดุ, กลุ่มงานจริยธรรม, กลุ่มคลัง, กลุ่ม ตรวจสอบภายใน, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคใต้, กองกฎหมาย, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ			
๓๒๓	สธ ๐๗๐๑.๑/๑๐๓๙ ขอเชิญร่วมบริจาคและสมทบทุนการจัด สร้างพระสัมพุทธเมตตาประจักษ์ เป็น พระพุทธรูปมาประธาน กรม สบส. ครบ รอบ ๒๐ ปี	๒๑/๐๘/๒๕๖๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, กองสุขศึกษา, ศูนย์บริการธุรกิจ สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ, กองสนับสนุนสุขภาพภาค ประชาชน, กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ, กองแบบแผน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร, กองสถานพยาบาลและ	พระราชกร ฐศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๒๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๔ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				การประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มงาน จริยธรรม, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคกลาง, เลขาธิการ กรม, กลุ่มแผนงาน, สำนักสื่อสาร และประชาสัมพันธ์, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กองกฎหมาย, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, กองวิศวกรรมการแพทย์, กลุ่มตรวจ สอบภายใน			
๓๒๔	สธ ๐๗๑๐.๐๓/๙๔๔ ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุม สัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ผ่าน ช่องทาง Facebook และ Youtube	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๐	
๓๒๕	สธ ๐๗๑๑.๖.๔/๑๐๒๓ ขอแจ้งแผนเพิ่มประสิทธิภาพของกรม สนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๗/๐๘/๒๕๖๖	กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ	กองวิศวกรรมการแพทย์, กลุ่มงาน จริยธรรม, เลขาธิการกรม, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, กองสถานพยาบาลและการประกอบ โรคศิลปะ, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กองแบบแผน, กองสถานประกอบ การเพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๒	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๕ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				เหนือ, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, กองกฎหมาย, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กลุ่มแผนงาน, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, กองสุกศีกษา, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล			
๓๒๖	สธ ๐๗๒๐/ว๑๑๓๗ แจ้งปิดสำนักงานชั่วคราว	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๒	
๓๒๗	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๕๘ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๙ เรื่อง	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ,	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๓	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๖ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, กลุ่ม ตรวจสอบภายใน, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัด นครศรีธรรมราช, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค กลาง, กองสถานประกอบการเพื่อ สุขภาพ, กองสถานพยาบาลและการ ประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มบริหาร ทรัพยากรบุคคล, กองสนับสนุน สุขภาพภาคประชาชน, กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร, กลุ่มแผนงาน, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, กองแบบแผน, กองวิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ,			

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๗ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี			
๓๒๘	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๕๖ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๒๒/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, กลุ่ม ตรวจสอบภายใน, กองสถาน พยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่มงานจริยธรรม, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียง เหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, กองแบบแผน, กลุ่ม แผนงาน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัด ชลบุรี, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๒, กองวิศวกรรม	พรระษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๘ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				การแพทย์, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์บริการธุรกิจ สุขภาพ กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๓, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมทางการแพทย์ครบวงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค กลาง, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๗			
๓๒๙	สธ ๐๗๐๑.๑/ว๓๔๙๙ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, กลุ่มตรวจ สอบภายใน, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, กอง แบบแผน, กองวิศวกรรมทางการแพทย์, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค	พระราชกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๔	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๒๙ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ	
				กลาง, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, กลุ่มแผนงาน, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, ศูนย์ พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด ขอนแก่น, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กองกฎหมาย, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, ศูนย์ บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และ คุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ วงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๐, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์				

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓๐ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคเหนือ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๘			
๓๓๐	สธ ๐๗/๐๑.๑/ว๓๔๘๒ แจ้งเวียนหนังสือราชการ จำนวน ๒ เรื่อง	๒๓/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กลุ่มตรวจสอบภายใน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์บริหารจัดการเรื่องร้องทุกข์และคุ้มครองผู้บริโภคด้านบริการสุขภาพ, สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กลุ่มแผนงาน, กองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคกลาง จังหวัดชลบุรี, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๕, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๙, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๒, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคกลาง, กอง	พรพรกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๕	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓๑ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
				วิศวกรรมการแพทย์, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๗, ศูนย์พัฒนาการ สาธารณสุขมูลฐานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น, สำนัก ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบ วงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุข มูลฐานภาคเหนือ จังหวัดนครสวรรค์, กองกฎหมาย, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพ ที่ ๑๒, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, กองแบบแผน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๑๑, ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา, กลุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศ, กองสถาน ประกอบการเพื่อสุขภาพ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๘, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๓, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ ๑๐			
๓๓๓๑	สธ ๐๗๑๙.๐๑/๑๑๔๐๙ ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งอุปโภค บริโภค และเวชภัณฑ์ยาที่เป็น	๒๔/๐๘/๒๕๖๖	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๔	ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ ๖	พรรษกร ภูศรี	๒๘/๐๘/๒๕๖๖ ๐๙:๓๕	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓๒ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๓๒	มท ๐๗๑๐/ว๓๗๗๓ ขอเชิญประชุม คกก.ควบคุมอาคารครั้งที่ ๑๕๓๖-๑๘/๒๕๖๖ วันที่ ๓๑ ส.ค.๖๖ (นายสรพงษ์ ทัพภวิมล)	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร กรมโยธาธิการและผังเมือง	กองแบบแผน	พรรัชกร ภูศรี	๒๙/๐๘/๒๕๖๖ ๑๒:๕๗	
๓๓๓	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๕๔๕ ขอเชิญร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๖ วันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๖	๒๕/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	สำนักสื่อสารและประชาสัมพันธ์, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ, กลุ่ม แผนงาน, กองแบบแผน, กอง กฎหมาย, กองสถานพยาบาลและ การประกอบโรคศิลปะ, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, เลขาธิการ กรม, กลุ่มงานจริยธรรม, กลุ่มตรวจ สอบภายใน, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, กองวิศวกรรมการ แพทย์, กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้, กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน, สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมแพทย์ ครบวงจร, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร, กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล, กองสุขศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคกลาง	พรรัชกร ภูศรี	๒๙/๐๘/๒๕๖๖ ๑๒:๕๙	

รายงานสมุดทะเบียนรับ กลุ่มพัฒนาระบบบริการและวิชาชีพ
ประจำปี ๒๕๖๖ ช่วงวันที่รับ ๒๔/๐๗/๒๕๖๖ ถึง ๒๙/๐๘/๒๕๖๖

หน้าที่ ๓๓ / ๓๓
พิมพ์ ณ วันที่ ๒๙/๐๘/๒๕๖๖
หนังสือทั้งหมด ๖๖ ฉบับ

เลขรับ	เลขที่/เรื่อง	ลงวันที่	จาก	ถึง	ผู้รับ	วันเวลารับ	การปฏิบัติ
๓๓๔	สธ ๐๗๐๑.๑/๓๕๕๘ ขอส่งข้อมูลกำหนดการปฏิบัติราชการ ประจำสัปดาห์ของผู้บริหารระดับสูง	๒๘/๐๘/๒๕๖๖	สำนักงานเลขานุการกรม	กองกฎหมาย, สำนักสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์, กองสถานพยาบาล และการประกอบโรคศิลปะ, กลุ่ม พัฒนาระบบบริหาร, สำนักส่งเสริม อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร, กองวิศวกรรมการแพทย์, กลุ่มงาน จริยธรรม, กองสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพ, กองสนับสนุนสุขภาพ ภาคประชาชน, กลุ่มตรวจสอบ ภายใน, ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กอง สุศึกษา, ศูนย์สนับสนุนบริการ สุขภาพภาคเหนือ, กองแบบแผน, ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพภาคกลาง, ศูนย์ สนับสนุนบริการสุขภาพภาคใต้	พรพรกร ภูศรี	๒๙/๐๘/๒๕๖๖ ๑๓:๐๐	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงาน รอบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่อง ค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้างสะสม (6)=(4)-(5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	3	0	3	10	2	10	13	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	0	0	0	1	1	0	0	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
5	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	0	0	0	1	0	1	1	
6	ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ	13	13	0	0	0	0	0	
7	ตรวจสอบระบบ	1	1	0	1	1	0	0	
8	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ	2	1	1	0	0	0	1	
9	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
10	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	0	0	0	0	0	0	0	
11	แต่งตั้งคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	2	1	1	1	1	0	1	
12	ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา	2	2	0	1	1	0	0	
13	หนังสือเวียน / อื่นๆ	2	2	0	0	0	0	0	
รวม		25	20	5	15	6	11	16	

รายงานสรุปผลปฏิบัติงานทำงาน รอบระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2566

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่รับ กลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วัน ทำ การ	ดำเนิน การ (%)	คาดว่าจะ แล้ว เสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางแผน/ออกแบบ											
1	ชม 0033.301/220	200	09 มี.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่	รพ.เชียงดาว	เชียงใหม่	คุณเกรียงไกร				กำลังดำเนินการ
2	สป 0033.2/1725	204	14 มี.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและออกแบบบ่อ บำบัดน้ำเสีย	รพ.สมุทรปราการ	สมุทรปราการ	คุณเกศรา				กำลังดำเนินการ
3	สธ 0722/537	290	25 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.ปทุมรัตน์	ร้อยเอ็ด	คุณกมลรัตน์				กำลังดำเนินการ
4	ฉช 0033.3/485	292	29 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์บุคลากร วิเคราะห์ ตรวจสอบ ประเมิน และออกแบบระบบ บำบัดน้ำเสียที่รพ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา	รพ.คลองเขื่อน	ฉะเชิงเทรา	คุณเกศรา				กำลังดำเนินการ
5	นค 0033.301(03)/1642	294	31 พ.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและออกแบบ ระบบเส้นท่อน้ำเสีย และปรับแบบ มาตรฐานพร้อมคำนวณให้เหมาะสมกับ สภาพพื้นที่	รพ.โพธิ์พิสัย	หนองคาย	คุณเกศรา				กำลังดำเนินการ
6	สธ 0722/569	306	13 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่กองแบบแผน สำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ. กุดรัง	มหาสารคาม	คุณกมลรัตน์				กำลังดำเนินการ
7	นว 0033/1015	308	13 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และออกแบบท่อ เมนระบบประปาภายในสสจ.นครสวรรค์	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด นครสวรรค์	นครสวรรค์	คุณธิดิภัทร				กำลังดำเนินการ
8	สต 0033.36/4086	324	30 มิ.ย. 66	ขอสนับสนุนบุคลากรด้านการวางแผนผังแม่ และระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.มะนัง	สตูล	คุณกมลรัตน์				กำลังดำเนินการ

9	นค 0033.301(03)/2015	331	06 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจและออกแบบระบบเส้นท่อน้ำเสีย และปรับแบบมาตรฐานพร้อมคำนวณให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่	รพ.โพธิพิสัย	หนองคาย	คุณเกศรา					กำลังดำเนินการ
10	รน 0033.301(รพข31)/1804	352	21 ก.ค. 66	ขอสนับสนุนแบบแปลน พร้อมประมาณราคา ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.กระบุรี	ระนอง						กำลังดำเนินการ
11	สธ 1103.29/834	354	27 ก.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย	วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า	จันทบุรี	คุณเกศรา					กำลังดำเนินการ
12	สฎ 1632.1.05/2151	364	9 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากรสำรวจและออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.เกาะเต่า	สุราษฎร์ธานี	คุณกมลรัตน์					กำลังดำเนินการ
13	นน 0033.301.04/2650	371	22 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สำรวจ ออกแบบประมาณราคา ออกงวดเงินงวดงาน ระบบบำบัดและท่อส่งน้ำเสีย	รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว	น่าน	คุณเกรียงไกร					กำลังดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ												
1	สธ 0205.11/3747	367	16 ส.ค. 66	ขออนุเคราะห์ให้เจ้าหน้าที่กองแบบแผนดำเนินการออกแบบแปลนด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมของระบบท่อบรรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของรพ.วชิระภูเก็ต	รพ.วชิระภูเก็ต	ภูเก็ต	คุณกมลรัตน์					กำลังดำเนินการ
3. ปรึกษาแบบ / ค้นหาแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
4. ตรวจรับรองแบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
5. ประมาณราคา / ตรวจสอบราคา												
6. ตรวจการจ้าง /ตรวจรับพัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
7. ตรวจสอบระบบ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
8. ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ							(ไม่มีงานคงค้าง)					
1	นธ 0033.901/2063	353	26 ก.ค. 66	ส่งเอกสารขออนุมัติใช้วัสดุ-อุปกรณ์ การก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.สุโงโกะ-ลก	นราธิวาส	คุณกมลรัตน์					กำลังดำเนินการ
9. พิจารณาค่า K							(ไม่มีงานคงค้าง)					
10. แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน							(ไม่มีงานคงค้าง)					
11. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา												

1	พจ 0033.301/968	360	7 ส.ค. 66	ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญ ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.วังทรายพูน	พิจิตร	คุณธิดิภัทร				กำลังดำเนินการ
12. ประชุมคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา							(ไม่มีงานคงค้าง)				
13.หนังสือเวียน / อื่นๆ							(ไม่มีงานคงค้าง)				



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

รายงานความก้าวหน้างานออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย

โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2566

กลุ่มระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งแวดล้อม


วันพุธ ที่ 30 สิงหาคม 2566

เขตสุขภาพที่ 1



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	ลักษณะงาน	สถานะ					กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งานสิ่งแวดล้อม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณราคา	งวดงาน-งวดเงิน		
1.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยึดเวลา ขนาด 800 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลแพร่	826618	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	90%	100%	80%	0%	สิงหาคม	งานระบบไฟฟ้า ศบส.1
2.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยึดเวลา ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลเทิง	826615	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	100%	100%	80%	0%	สิงหาคม	งานระบบไฟฟ้า ศบส.7

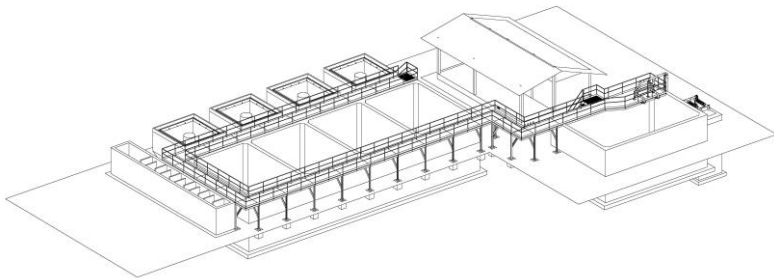


เขตสุขภาพที่ 2



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	ระบบท่อ รวบรวมน้ำ เสีย	ลักษณะ งาน	สถานะ					กำหนด การ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งาน สิ่งแวดล้อม	งาน โครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณ ราคา	งวดงาน- งวดเงิน		
3.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบ Integrated Fixed Film Activated Sludge (IFAS) ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลอัมพวง	826609	เห็นชอบ	ระบบท่อเดิม	สร้างทดแทน	80%	50%	50%	30%	0%	กันยายน	
4.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเดิม อากาศยัดเวลา ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลเขาค้อ	826615	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	50%	50%	30%	0%	กันยายน	

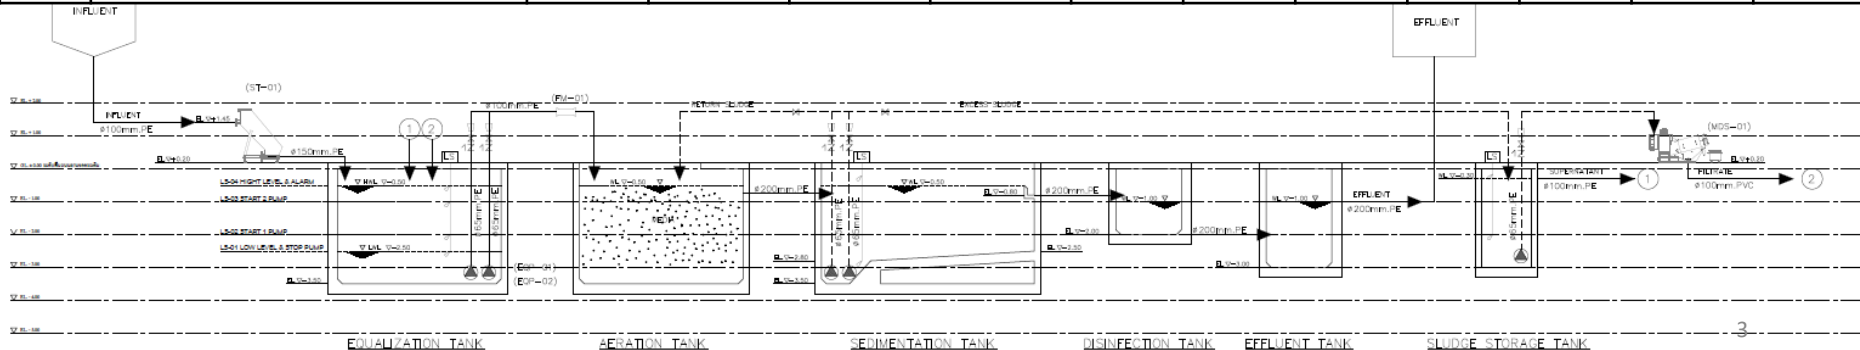


เขตสุขภาพที่ 3

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	ระบบท่อ รวบรวมน้ำ เสีย	ลักษณะ งาน	สถานะ					กำหนด การ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งาน สิ่งแวดล้อม	งาน โครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณ ราคา	งวดงาน- งวดเงิน		
5.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติม อากาศยัดเวลา ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลลานสัก	826619	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	90%	80%	50%	30%	0%	กันยายน	

เขตสุขภาพที่ 4

6.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติม อากาศยัดเวลา ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลป่าโมก	826620	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	50%	50%	30%	0%	กันยายน	
----	---	--------	---------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	----	---------	--



เขตสุขภาพที่ 5

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	ลักษณะงาน	สถานะ					กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งานสิ่งแวดล้อม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณราคา	งวดงาน-งวดเงิน		
7.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเดิมอากาศยัดเวลา ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี	826601	เห็นชอบ	ระบบท่อเดิม	สร้างทดแทน	90%	50%	100%	30%	0%	กันยายน	งานไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม ศบส.5
8.	ถังกรองเติมอากาศ (Aerobic Filter) ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลวัดบางปลา (สมุทรสาคร 4)	826617	-	กองแบบแผน	สร้างใหม่	100%	50%	90%	30%	0%	กันยายน	

เขตสุขภาพที่ 6

9.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเดิมอากาศยัดเวลา ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อบรรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	826601	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	50%	10%	30%	0%	กันยายน	
----	--	--------	---------	-------	------------	-----	-----	-----	-----	----	---------	--

เขตสุขภาพที่ 7

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	ระบบท่อ รวบรวมน้ำ เสีย	ลักษณะ งาน	สถานะ					กำหนด การ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งาน สิ่งแวดล้อม	งาน โครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณ ราคา	งวดงาน- งวดเงิน		
10.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาฬสินธุ์	826621	เห็นชอบ	สสจ.กาฬสินธุ์	สร้างทดแทน	80%	50%	100%	80%	0%	กันยายน	งานไฟฟ้า ศบส.7
11.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลชนบท จังหวัดขอนแก่น	826605	-	กองแบบแผน	สร้างทดแทน	80%	50%	50%	30%	0%	กันยายน	
12.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 150 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด	826610	-	ระบบท่อเดิม	สร้างทดแทน	80%	50%	10%	30%	0%	กันยายน	

เขตสุขภาพที่ 8

13.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	826602	เห็นชอบ	กองแบบแผน	สร้างทดแทน	100%	100%	100%	100%	100%	กันยายน	งานไฟฟ้า ศบส.7
-----	--	--------	---------	-----------	------------	------	------	------	------	------	---------	-------------------

เขตสุขภาพที่ 9

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	ระบบท่อ รวบรวมน้ำ เสีย	ลักษณะ งาน	สถานะ					กำหนด การ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งาน สิ่งแวดล้อม	งาน โครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณ ราคา	งวดงาน- งวดเงิน		
14.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	826612	เห็นชอบ	อบจ. นครราชสีมา	สร้างทดแทน	80%	100%	100%	80%	0%	สิงหาคม	งานระบบ ไฟฟ้า ศบส.7

เขตสุขภาพที่ 10




15.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 200 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร	826622	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	50%	100%	80%	0%	กันยายน	งานไฟฟ้า ศบส.7
16.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร	826623	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	50%	50%	30%	0%	กันยายน	
17.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยัดเวลา ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน โรงพยาบาลภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ	826624	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	50%	50%	30%	0%	กันยายน	

เขตสุขภาพที่ 11



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจ เห็นชอบ	ระบบท่อ รวบรวมน้ำ เสีย	ลักษณะ งาน	สถานะ					กำหนด การ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งาน สิ่งแวดล้อม	งาน โครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณ ราคา	งวดงาน- งวดเงิน		
18.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยี่ตเวลา ขนาด 800+400 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี	826613	เห็นชอบ	เอกชน	สร้างเสริม	70%	30%	20%	10%	0%	กันยายน	ออกแบบ ร่วมกับ ศบส.11
19.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศ ยี่ตเวลา ขนาด 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน และ ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี	826605	-	เอกชน	สร้างทดแทน	90%	80%	50%	30%	0%	กันยายน	


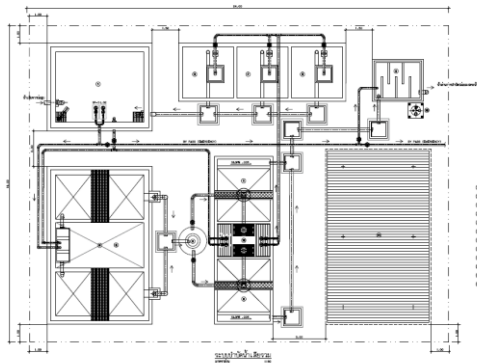
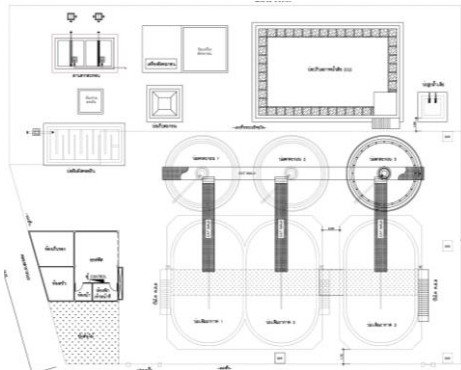


เขตสุขภาพที่ 12



กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Department of Health Service Support

ลำดับ	แบบ	เลขที่แบบ	ผู้ตรวจเห็นชอบ	ระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย	ลักษณะงาน	สถานะ					กำหนดการแล้วเสร็จ	หมายเหตุ
						งานสิ่งแวดล้อม	งานโครงสร้าง	งานระบบฯ	ประมาณราคา	งวดงาน-งวดเงิน		
20.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยัดเวลา ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลท่าแพ จังหวัดสตูล	826604	เห็นชอบ	กองแบบแผน	สร้างทดแทน	80%	80%	30%	30%	0%	กันยายน	
21.	ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสระเติมอากาศ ขนาด 60 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำ โรงพยาบาลตะโหมด จังหวัดพัทลุง	826607	เห็นชอบ	ศบส.12	สร้างทดแทน	80%	80%	50%	30%	0%	กันยายน	
22.	ระบบบำบัดน้ำเสียตะกอนเร่งแบบเติมอากาศยัดเวลา ขนาด 30 ลูกบาศก์เมตร/วัน และระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา	826627	-	เอกชน	สร้างทดแทน	80%	80%	30%	30%	0%	กันยายน	

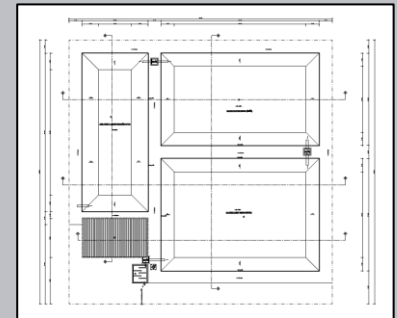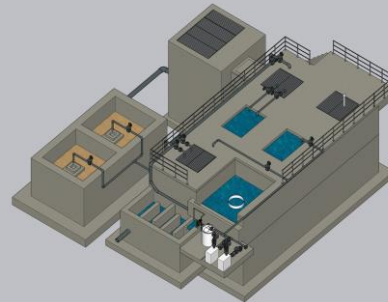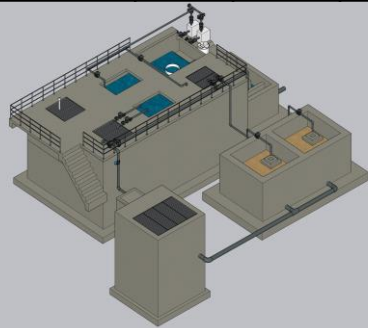

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 18 ส.ค. 66

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ	กิจกรรม	เรื่องเดือนนี้			เรื่องค้างจากเดือนก่อน			ค้างสะสม รวมไป เดือนหน้า (3)+(6)	หมายเหตุ
		เรื่อง เข้า (1)	เรื่อง ออก (2)	เรื่องค้าง (3)=(1)- (2)	ค้าง สะสม เดือน ก่อน (4)	ค้าง สะสม แล้ว เสร็จ (5)	คงเหลือ ค้าง สะสม (6)=(4)- (5)		
1	งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ	5	3	2	2	2	0	2	
2	งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ	5	0	5	6	1	5	10	
3	ปรึกษาแบบ/ค้นหาแบบ	0	0	0	0	0	0	0	
4	ตรวจรับรองแบบ	3	3	0	2	1	1	1	
5	ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้เพิ่มเติม)	2	1	1	2	1	1	2	
6	ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา	0	0	0	2	1	1	1	
7	แบ่งงวดงาน/งวดเงิน	0	0	0	0	0	0	0	
8	ตรวจเช็คผัง	0	0	0	0	0	0	0	
9	ตรวจการจ้าง	3	3	0	0	0	0	0	
10	ตรวจสอบระบบอาคาร	12	12	0	0	0	0	0	
11	ตรวจพิจารณา Shop/เอกสาร/วัสดุ								
	11.1 งานสถาปัตยกรรม	0	0	0	0	0	0	0	
	11.2 งานวิศวกรรมโยธา	0	0	0	0	0	0	0	
	11.3 งานระบบไฟฟ้า	35	34	1	5	5	0	1	
	11.4 งานระบบสุขาภิบาล	18	17	1	3	3	0	1	
	11.5 งานระบบเครื่องกล	30	26	4	11	6	5	9	
	11.6 งานแบบ COMBINE	1	1	0	0	0	0	0	
12	พิจารณาค่า k	0	0	0	0	0	0	0	
13	แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน	0	0	0	0	0	0	0	
14	แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ	3	3	0	0	0	0	0	
15	ประชุม	29	29	0	0	0	0	0	
16	อื่นๆ	47	46	1	0	0	0	1	
	รวม	193	178	15	33	20	13	28	

รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือน ระหว่างวันที่ 15 ก.ค. - 18 ส.ค. 66

กลุ่มระบบประกอบอาคาร

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วที่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
1. งานสำรวจ/วางผัง/ออกแบบ (คงค้าง 2 งาน)											
1	สบ 0033.301.3/3037	1461	17 ส.ค. 66	สำรวจออกแบบประมาณราคา งาน ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอกและอาคาร ผู้ป่วยใน งบ 2566	รพ.หนองโดน	สระบุรี	คุณทศวรรษ คุณศรัณยู คุณ วิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	สบ 0033.301.3/10678	1462	17 ส.ค. 66	สำรวจออกแบบประมาณราคา ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก	รพ.มวกเหล็ก	สระบุรี	คุณทศวรรษ คุณศรัณยู คุณ วิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2. งานออกแบบ/ซ่อมแซม/เขียนแบบ (คงค้าง 10 งาน)											
1	สธ 0703.004/98	741	1 พ.ค. 66	ปรับแบบละประมาณราคาแบบ ก่อสร้างอาคาร X-ray คลอด ICU และ พักผู้ป่วย แบบเลขที่ 10937 โรงพยาบาลอ่างทอง (งบ 2567)	กลุ่มออกแบบ และกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ 4		คุณทศวรรษ คุณวิจิตร คุณ ศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
2	สธ 0703.004/111	859	23 พ.ค. 66	ออกแบบระบบไฟฟ้า อาคาร บำบัดรักษา 3 ชั้น แบบมาตรฐาน(งาน ออกแบบสำหรับปีงบประมาณ 2567)	กลุ่มออกแบบ และกำกับ ก่อสร้าง เขตที่ 4		คุณไพรัช คุณ ทิชานนท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	สธ 0703.005/101	954	1 มิ.ย. 66	ส่งแบบร่าง เขตสุขภาพที่ 5 รพ.โพธาราม (สธ 0205.05/670)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 5		คุณเวชยันต์ คุณธีรพล คุณ จงรักษ์				ส่งแบบร่างมา วันที่ 7 ก.ค. 66
4	สธ 0703.006/190	1182	6 ก.ค. 66	ออกแบบประมาณราคาในการปรับปรุง อาคารสำนักงานด้านควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างประเทศ และที่พักบุคลากร กองด้านควบคุมโรค (สธ 0447/641)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณธีรพล	-	-	-	สุขาภิบาล และ เครื่องกล ส่ง แบบ+ราคาแล้ว
5	สธ 0703.004/146	1239	11 ก.ค. 66	แบบสถาปัตยกรรม 1. อาคาร สำนักงาน 5 ชั้น สสจ.นนทบุรี 2. อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและบำบัดรักษา และผู้ป่วยใน 5 ชั้น รพ. พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 4		รายการที่1 (คุณทศวรรษ คุณศรัณยู คุณ วิจิตร) รายการที่2 (คุณสรศักดิ์ คุณ อภิญญา คุณ จงรักษ์)	-	-	-	ขอไฟล์ Cat
6	สธ 0703.006/200	1276	19 ก.ค. 66	ปรับแบบอาคารห้องปฏิบัติการควบคุม โรค 3 ชั้น แบบเลขที่ 10951 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 6		คุณเวชยันต์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินกา รแล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
7	สร 0703.003/76	1347	27 ก.ค. 66	จัดทำแบบอาคารผู้ป่วยหนัก ผู้ป่วยใน คลอด ผ่าตัด โรงพยาบาลอุทัยธานี (สร 0205.03/512 วันที่ 28 ธันวาคม 2565)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 3		คุณสุรพงษ์ คุณทศวรรษ คุณวิจิตร	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
8	สร 0703.017/22	1368	6 ส.ค. 66	ส่งแบบร่างงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ชุด รพ.อุ้มผาง จ.ตาก เพื่อ ดำเนินการออกแบบในส่วนงาน วิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มพัฒนาองค์ ความรู้และ นวัตกรรม		คุณอภิญา	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
9	สร 0703.015/69	1369	6 ส.ค. 66	ส่งแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบ บำบัดน้ำเสียขนาด 60 ลบ.ม/วัน รพ.ตะ โหมด จ.พัทลุง เพื่อดำเนินการออกแบบ ในส่วนงานวิศวกรรมไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง	กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม		คุณธิชานนท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	สร 0703.015/68	1370	6 ส.ค. 66	ส่งแบบวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระบบ บำบัดน้ำเสียขนาด 90 ลบ.ม/วัน รพ. ลานสัก จ.อุทัยธานี	กลุ่มระบบบำบัด น้ำเสียและ สิ่งแวดล้อม		คุณทศวรรษ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. ปรีกษาแบบ/คั่นหาแบบ

(ไม่มีงานค้งค่าง)

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินกา รแล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
4. ตรวจรับรองแบบ (คงค้าง 1 งาน)											
1	นบ 0033.301.7/362	1190	7 ก.ค. 66	ตรวจสอบและรับรองรูปแบบรายการ จ้างติดตั้งระบบพลังงานทดแทนด้วยโซ ล่าเซลล์	รพ.ศูนย์บริการ การแพทย์นันทบุรี	นันทบุรี	คุณทิชานนท์	-	-	-	รอแบบจากการ ไฟฟ้า
5. ทำเอกสารประกอบแบบ(ใบชี้ที่เดิม) (คงค้าง 2 งาน)											
1	สธ 0703.012/55	664	18 เม.ย. 66	ขอให้จัดทำรายการประกอบแบบ ประมาณราคา งานงานงวดเงิน รพ.รา มัน จ.สตูล (ยล 0033.3/467 ลว 30/3/66)	กลุ่มออกแบบ และกำกับการ ก่อสร้าง เขตที่ 12		คุณปิติกัทร คุณสุทัศน์ คุณ เสาวภา	-	-	-	รอไฟล์ จาก สธ.
2	สธ 0820.31/1384	1335	26 ก.ค. 66	ขอรายละเอียดรายการก่อสร้างอาคาร ผู้ป่วยนอก 4 ชั้นเต็มรูปแบบก่อนปรับ ลดงบประมาณ ขอแบบงานส่วนที่ ยกเลิกจากรูปแบบ พร้อมรายละเอียด ราคากลาง งานงาน-เงิน ระยะเวลา และปริมาณงานส่วนที่เหลือ และขอผู้ เชี่ยวชาญร่วมพิจารณาเพื่อกลั่นกรอง ทางเทคนิคก่อสร้างฯ	สถาบันกัลยาณ์ ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต	กทม.	คุณศรีณยู คุณภาคนุมิ	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
6. ประมาณราคา/ตรวจสอบราคา (คงค้าง 1 งาน)											
1	สธ 0207.03.4/14721	991	8 มิ.ย. 66	ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการ พิจารณาความเหมาะสมของราคา สิ่งก่อสร้าง	องบริหารการ สาธารณสุข สป.	นนทบุรี	(เขต11) ปิติ ภัทร ไพรัช สุ ทัศน์ (เขต1) สุ รพงษ์ อภิญา จรงค์ (เขต 4) ศรีณยู ทศวรรษ วิจิตร (เขต5) เวชยันต์ อีรพล จรงค์ (เขต 7) ศรีณยู ภาคภูมิ นฤ นาท	-	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
7. แบ่งงวดงาน/งวดเงิน (ไม่มีงานคงค้าง)											
8. ตรวจเช็คผัง (ไม่มีงานคงค้าง)											
9. ตรวจการจ้าง (ไม่มีงานคงค้าง)											
10. ตรวจสอบระบบอาคาร (ไม่มีงานคงค้าง)											

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินกา รแล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11. ตรวจสอบ Shop/เอกสาร/วัสดุ											
11.1 งานสถาปัตยกรรม											
11.2 งานวิศวกรรมโยธา											
11.3 งานระบบไฟฟ้า (คงค้าง 1 งาน)											
1	พร 0033.001/4454	1364	6 ส.ค. 66	พิจารณาตรวจสอบระบบโสตทัศน คอมพิวเตอร์ ภาพและเสียง อาคาร ผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	รพ.ลอง	แพร่	คุณกิจนันท์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.4 งานระบบสุขาภิบาล (คงค้าง 1 งาน)											
1	พร 0033.001/4450	1404	15 ส.ค. 66	พิจารณา Shop Drawing ถึงบำบัด อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น	รพ.ลอง	แพร่	คุณจงรักษ์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
11.5 งานระบบเครื่องกล (คงค้าง 9 งาน)											
1	สบ 0033.1/4772	671	18 เม.ย. 66	พิจารณาระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคารโรงพยาบาลระดับปฐมภูมิ (สาขา โรงพยาบาลสระบุรี) คสล. 4 ชั้น	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
2	สบ 0033.1/6954	857	22 พ.ค. 66	พิจารณาระบบแก๊สทางการแพทย์ อาคาร รพ.ระดับปฐมภูมิ	รพ.สระบุรี	สระบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินการ แล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
3	สธ 0421.1/1191	1067	20 มิ.ย. 66	พิจารณาพัฒลม อาคารห้องปฏิบัติการ ควบคุมโรค	สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 4	สระบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
4	นบ 0033.2/9991	1220	11 ก.ค. 66	พิจารณาระบบก๊าซทางการแพทย์ อาคารความเชี่ยวชาญด้านอุบัติเหตุ และพักผู้ป่วย 9 ชั้น	รพ.พระนั่งเกล้า	นนทบุรี	คุณเสรี	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
5	สธ 0321/4215	1252	13 ก.ค. 66	พิจารณาวัสดุพัฒลมระบายอากาศ โครงการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่หอผู้ป่วย ส.9	สถาบันสุขภาพ เด็กแห่งชาติมหา ราชินี	กทม.	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
6	สธ 0317/4268	1458	17 ส.ค. 66	พิจารณาวัสดุเครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling Mounted Cassette Type อาคารศูนย์วิจัยทางเภสัชกรรม (สถาบันฉิวหน่ง)	สถาบัน บำบัดรักษาและ ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพ ติดแห่งชาติบรม ราชชนนี	ปทุมธานี	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
7	สป 0033.303/1632	1406	15 ส.ค. 66	พิจารณาลิฟท์ อาคารผู้ป่วยนอก- อุบัติเหตุ 5 ชั้น	รพ.บางจาก	สมุทรปราการ	คุณเวชยันต์	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
8	ชก 0033.316/1297	1397	15 ส.ค. 66	พิจารณาเครื่องปรับอากาศ อาคารพัสดุ 2 ชั้น	รพ.ชนบท	ขอนแก่น	คุณศรัณยู	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา
9	สธ 0310/1822	1318	21 ก.ค. 66	พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ (MATERIAL APPROVED) ปรับปรุงห้องผ่าตัด	รพ.สงฆ์	กทม.	คุณสุรพงษ์ คุณทิตานนท์ (ตอบร่วมกัน)	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

ลำดับ ที่	เลขที่หนังสือ	เลขที่ รับกลุ่ม	วัน เดือน ปี (มอบหมายงาน)	ภารกิจ/อาคาร	สถานบริการ สุขภาพ	จังหวัด	ผู้รับผิดชอบ	เกิน 5 วันทำ การ	ดำเนินกา รแล้วกี่ เปอร์เซ็นต์ (%)	คาดว่าจะ แล้วเสร็จ	หมายเหตุ
11.6 งานแบบ COMBINE							(ไม่มีงานคงค้าง)				
12. พิจารณาค่า k							—				
13. ประชุม							(ไม่มีงานคงค้าง)				
14. อื่นๆ							(คงค้าง 1 งาน)				
1	ตง 0033.3501.1/2285	1334	26 ก.ค. 66	พิจารณารายละเอียด การขออุทธรณ์ ระบุง้องกระจกใสนิรภัยสำหรับผู้พิการ และขอส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ รายละเอียดและมาตรฐานเกี่ยวกับ อุปกรณ์หลักของลิฟท์ อาคารผู้ป่วย นอกการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก 4 ชั้น	รพ.ห้วยยอด	ตรัง	คุณปิติกัทร	-	-	-	อยู่ระหว่าง พิจารณา

๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง



๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

หลักฐานการประชุม การนำเสนอแบบ

๑. รพร.นครไทย



๒. รพร.สระแก้ว




๓. รพร.กระนวน

๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

หลักฐานการประชุม การนำเสนอแบบ

๔. รพร.กุดินารายณ์



๕. รพร.บ้านดุง



๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

หลักฐานการประชุม การนำเสนอแบบ

๖. รพร.ฉวาง



๗. รพร.สายบุรี



๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

๑. รพร.นครไทย



MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
นครไทย จังหวัดพิษณุโลก

MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

เพื่อใช้ในการพัฒนาโรงพยาบาลให้สามารถรองรับการขยายตัวของแผนผังที่ชัดเจน และสร้างคุณภาพในการให้บริการแก่ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กระบวนการจัดทำผังแม่บท (MASTER PLAN)

- SURVEY**
สำรวจข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล (อาคาร สิ่งปลูกสร้าง)
- DATA ANALYSIS**
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการวางแผนผังแม่บท
- DRAFT MASTER PLAN**
จัดทำร่างผังแม่บทของโรงพยาบาล
- PRESENT AND ASKING FOR OPINION**
นำเสนอร่างผังแม่บทของโรงพยาบาลต่อผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง
- IMPROVE MASTER PLAN**
ปรับปรุงผังแม่บทของโรงพยาบาล

MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

กระบวนการจัดทำผังแม่บท (MASTER PLAN)

- PREPARE REPORT AND MASTER PLAN**
จัดทำรายงานและผังแม่บท
- DELIVER AND PUBLISHING**
นำเสนอและเผยแพร่ผังแม่บท

MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ส่วนร่างผังแม่บท/ แผนผังแม่บท



MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

LAYOUT PLAN
(ผังแม่บท) (ปีงบประมาณ 2564 - 2565)

- พื้นที่: 1,000 ไร่
- พื้นที่: 1,000 ไร่
- โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ผังบริเวณ

ผังบริเวณ (ปีพ.ศ. 2560)
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

MASTER PLAN
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

MASTER PLAN

โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค



๒. รพร.สระแก้ว



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี จักรวาลสระบุรี

กระบวนการจัดทำแผนแม่บท (MASTER PLAN)



*** SURVEY**

• ดำเนินการสำรวจข้อมูล
โรงพยาบาลและโครงการ
(ปี 2561 - 2562 และปี 2563 - 2565)



*** DATA ANALYSIS**

• วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาเพื่อ
จัดกลุ่มและพิจารณาความ
เหมาะสมของแผนแม่บท



*** DRAFT MASTER PLAN**

• จัดทำร่างแผนแม่บทเพื่อ
นำเสนอทาง ศส. และขอ
ความเห็นจาก คณะผู้บริหาร
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง



*** PRESENT AND ASKING FOR OPINIONS**

• นำร่างแผนแม่บทมาเสนอ
และรับฟังความคิดเห็น
เพื่อปรับปรุงแก้ไขร่าง
แผนแม่บทให้มีความ
เหมาะสม



*** IMPROVE MASTER PLAN**

• ปรับปรุงแผนแม่บทให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น

| แผนแม่บท : โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี จักรวาลสระบุรี



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชระแก้ว จังหวัดสกลนคร

กระบวนการจัดทำแผนแม่บท (MASTER PLAN)



- PREPARE REPORT AND MASTER PLAN
- จัดทำเอกสารขอรับการอนุมัติ



- DELIVERY AND PUBLISHING
- จัดส่งเอกสารและนำขึ้นเว็บไซต์โรงพยาบาลเพื่อให้บริการประชาชนได้ทราบ



พัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธราชระแก้ว



MASTER PLAN

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ราชเวช จังหวัดสระแก้ว

คำอธิบายภาพ

- ภาพนี้แสดง Master plan (ผัง) ของพื้นที่ 100 ไร่เศษ ในพื้นที่ 1,000 ไร่เศษ ที่ได้รับอนุญาตจากกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

สีพื้นผิว

- สีเขียว หมายถึง พื้นที่สีเขียว
- สีน้ำเงิน หมายถึง พื้นที่อาคาร
- สีเหลือง หมายถึง พื้นที่อาคาร
- สีชมพู หมายถึง พื้นที่อาคาร
- สีฟ้า หมายถึง พื้นที่อาคาร
- สีเทา หมายถึง พื้นที่อาคาร
- สีน้ำตาล หมายถึง พื้นที่อาคาร
- สีดำ หมายถึง พื้นที่อาคาร



[illegible]

๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

๓. รพร.กระนวน



๔. รพร.กุนิหารายณ์



๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

๕. รพร.บ้านดุง





MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

๒๕ ๑๑ ๖๕

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผลลัพท์ของโครงการ

โรงพยาบาล/สถานบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีผังแม่บทด้านอาคารและสภาพแวดล้อมในการพัฒนาอาคารภาคคีตทางด้านการบริการสุขภาพระดับจังหวัด เช่น แผนผังอาคาร (SERVICE PLAN) ของกระทรวง

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เพื่อให้มีการพัฒนาของในด้านอาคารและสภาพแวดล้อมที่ชัดเจนเหมาะสม โดยมีการจัดทำผังแม่บทโดยใช้หลักการที่ครอบคลุมในการออกแบบผังแม่บทของโรงพยาบาล และใช้ผังอาคารและสภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ของสถานนั้นๆ



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

กระบวนการจัดทำผังแม่บท (MASTER PLAN)



* SURVEY

* ดำเนินการสำรวจพื้นที่อาคารและสิ่งก่อสร้าง (โครงสร้าง / ฐานดินอาคาร / สภาพแวดล้อม)



* DATA ANALYSIS

* วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ เพื่อเป็นข้อมูลในการออกแบบผังแม่บท



* DRAFT MASTER PLAN

* ออกแบบผังแม่บทเบื้องต้น โดยพิจารณาจากข้อมูลที่ได้จากแบบสำรวจ และพิจารณาความต้องการในการพัฒนาอาคารและสิ่งก่อสร้าง



* PRESENT AND ASKING FOR OPINIONS

* นำเสนอผังแม่บทเบื้องต้น และรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง



* IMPROVE MASTER PLAN

* ปรับปรุงผังแม่บทให้สอดคล้องกับความต้องการ



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

กระบวนการจัดทำผังแม่บท (MASTER PLAN)



* PREPARE REPORT AND MASTER PLAN

* จัดทำรายงานและผังแม่บท



* DELIVERY AND PUBLISHING


* จัดทำและเผยแพร่ผังแม่บทให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอาคารและสิ่งก่อสร้าง



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

สำรวจพื้นที่ ขั้วข้อมูลจัดทำผังแม่บท



๒๕ ๑๑ ๖๕


กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผังแม่บท



สีน้ำเงิน : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)

สีน้ำเงินเข้ม : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)

สีน้ำเงินอ่อน : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)

สีน้ำเงินเข้ม : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)

สีน้ำเงินอ่อน : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)

สีน้ำเงินเข้ม : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)

สีน้ำเงินอ่อน : อาคารและสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่ (Existing Building and Infrastructure)



๒๕ ๑๑ ๖๕

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผังแม่บท



ผังแม่บท

๒๕ ๑๑ ๖๕

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

ผังแม่บท



๒๕ ๑๑ ๖๕

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

๖. รพพร.ฉวาง





MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

34 K.A. 08

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ผลผลิตของโครงการ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง มีแผนแม่บทด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ (SERVICE PLAN) อย่างเหมาะสม

ความสำคัญและที่มาของโครงการ

เพื่อให้การพัฒนาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง มีแผนแม่บทด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการพัฒนาบริการทางการแพทย์ด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ (SERVICE PLAN) อย่างเหมาะสม



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

กระบวนการจัดทำแผนแม่บท (MASTER PLAN)

SURVEY

สำรวจข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ (พื้นที่ / ฐานข้อมูล / สภาพพื้นที่ / สภาพแวดล้อม)

DATA ANALYSIS

วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ (พื้นที่ / ฐานข้อมูล / สภาพพื้นที่ / สภาพแวดล้อม)

DRAFT MASTER PLAN

ร่างแผนแม่บทเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ (พื้นที่ / ฐานข้อมูล / สภาพพื้นที่ / สภาพแวดล้อม)

PRESENT AND ASKING FOR OPINIONS

นำเสนอแผนแม่บทเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ (พื้นที่ / ฐานข้อมูล / สภาพพื้นที่ / สภาพแวดล้อม)

IMPROVE MASTER PLAN

ปรับปรุงแผนแม่บทเบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ (พื้นที่ / ฐานข้อมูล / สภาพพื้นที่ / สภาพแวดล้อม)



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

สรุปสาระสำคัญของแผนแม่บท

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในท้องถิ่นได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ (SERVICE PLAN) อย่างเหมาะสม

ขอบเขตของโครงการ

ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง

ระยะเวลา

ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2565 - 2570)

งบประมาณ

ประมาณ 10 ล้านบาท



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

LAYOUT PLAN

ผังบริเวณ (Site Plan) - ส่วนราชการ (K.A. 08)

พื้นที่

พื้นที่ 100 ไร่

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ 30 ไร่

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่ 20 คัน



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ผังบริเวณ

พื้นที่

พื้นที่ 100 ไร่

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ 30 ไร่

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่ 20 คัน



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

ผังบริเวณ

พื้นที่

พื้นที่ 100 ไร่

ที่ตั้ง

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชฉวาง จังหวัดนครราชสีมา

พื้นที่ก่อสร้าง

พื้นที่ 30 ไร่

พื้นที่จอดรถ

พื้นที่ 20 คัน

๑.๒.๓ ผังแม่บทโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ๗ แห่ง

๗. รพ.ร.สายบุรี



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
สายบุรี จังหวัดปัตตานี

MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

ความสำคัญและเป้าหมายของโครงการ

MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กระบวนการจัดทำผังแม่บท (MASTER PLAN)

SURVEY

สำรวจข้อมูลพื้นที่
กายภาพและสังคม
(ภูมิศาสตร์ / ความปลอดภัย /
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ)

DATA ANALYSIS

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
ในทางตรง เพื่อเป็นข้อมูล
การตัดสินใจขั้นต้น

DRAFT MASTER PLAN

เสนอร่างผังแม่บทเบื้องต้น
ให้ผู้บริหารโรงพยาบาล
พิจารณา และขอความเห็นชอบ

PERMIT AND ASKING
FOR OPINIONS

นำเสนอผังแม่บทเบื้องต้น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
โรงพยาบาลสายบุรี
เพื่อขอความเห็นชอบ

IMPROVE MASTER
PLAN

ปรับปรุงผังแม่บทเบื้องต้น
ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ

MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

กระบวนการจัดทำผังแม่บท (MASTER PLAN)

PREPARE REPORT
AND MASTER PLAN

จัดทำรายงานและผังแม่บท

DELIVER AND
PUBLISHING

นำเสนอผังแม่บทเบื้องต้น
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
โรงพยาบาลสายบุรี
เพื่อขอความเห็นชอบ

MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ส่วนประกอบ / องค์ประกอบผังแม่บท



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

LAYOUT PLAN

ผังแม่บท (Master Plan) - 1:10,000 (2015)

พื้นที่ : 1,000 ไร่ 0 ก. 0 ผ.

ที่ตั้ง :
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
จังหวัดปัตตานี



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ผังบริเวณ

พื้นที่ 1,000 ไร่ 0 ก. 0 ผ.

ที่ตั้ง :
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
จังหวัดปัตตานี



MASTER PLAN

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี จังหวัดปัตตานี

MASTER PLAN

พื้นที่ 1,000 ไร่ 0 ก. 0 ผ.

ที่ตั้ง :
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี
จังหวัดปัตตานี



การติดตามและประเมินผล
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566

ครั้งที่
7/2566

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
30 สิงหาคม 2566

วิสัยทัศน์กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ให้มีคุณภาพเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ ครบวงจร
2. พัฒนาและยกระดับการจัดการสุขภาพภาคประชาชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน
และเครือข่าย
3. พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์กองแบบแผน

มาตรฐานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมสาธารณสุขระดับสากล สร้างเสริมคุณค่าทางสุขภาพแก่ประชาชน
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ยุทธศาสตร์


1. การพัฒนารูปแบบด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
2. การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
3. การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ ด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
4. การสร้างความร่วมมือและพัฒนาขีดความสามารถของภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข
5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น

- จำนวน 7,137,580.00 บาท

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไตรมาสที่ 1-4

- จำนวน 7,06,958.00 บาท



ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์สู่แผนงานโครงการ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสถานพยาบาลภาครัฐ เอกชน และสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ สู่มาตรฐานสากลและพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร



การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดและประเมินเกณฑ์ มาตรฐาน องค์ความรู้ ด้าน
อาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข



โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์



โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง
(Database)

พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์กรสมรรถนะสูงตาม
หลักธรรมาภิบาล



แผนปฏิบัติการ
การบริหารจัดการองค์กร
เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนภารกิจ
กองแบบแผน

โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง
แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Bim Model) ครบทุกระบบ
งบประมาณ 1,300,000.- บาท (คืน 300,000) เหลือ 1,000,000.- บาท

แผนการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2566

สรุปผล BIM Model ทั้งหมด โดยเผยแพร่ผลการศึกษาในรูปแบบ
ไฟล์ดิจิทัล

ผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2566

รอบประชุมเชิงปฏิบัติการครบจึงจะดำเนินการสรุปผล Bim
Model

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน

1,300,000.00/1,300,000.00
(ส่งคืนตามหนังสือที่ สธ 0703.017/25 ลว. 15 สิงหาคม 2566)
จำนวน 300,000.-คงเหลือจำนวน 1,000,000.-บาท)

งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ

999,182.00/818.00

นายณัฐสิทธิ์ สมบูรณ์วิทย์ สถาปนิกปฏิบัติการ

โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database)
เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ฐานข้อมูล (Database)
รายการ รายละเอียดข้อมูลและเอกสารของอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบการของงบประมาณ
งบประมาณ 400,000.- บาท

แผนการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566	ผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566
กำหนดแนวทางและติดตามกำกับการทำงาน	1.ประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 15,18 สิงหาคม 2566 เพื่อชี้แจงการคัดเลือกแบบของแต่ละหมวด 2.ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 เพื่อพิจารณาแบบที่ได้คัดเลือกจากคณะทำงาน
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบัญชีรายการสิ่งก่อสร้างเป็นข้อมูลดิจิทัล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
การจัดทำรายละเอียดเอกสารและข้อมูล	อยู่ระหว่างดำเนินการ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
400,000.00/396,900.00	335,329.00/64,671.00

นายชาติศักดิ์กรินทร์ พาหุกุล สถาปนิกชำนาญการพิเศษ

**โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ
(งบดำเนินงานขับเคลื่อนงานนโยบาย) เพื่อออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียที่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับสถานบริการสุขภาพ งบประมาณ 350,000.- บาท**

แผนการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566	ผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2566
ออกแบบและจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ สถานบริการสุขภาพ จำนวน 12 แห่ง	ออกแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างส่งให้งานโครงสร้างและงานไฟฟ้าดำเนินการออกแบบต่อไป
สรุปและจัดพิมพ์เล่มเป็นเอกสารเผยแพร่	ไม่มีการรายงาน
ค่าวัสดุใช้สอย	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร/งบประมาณตามแผน	งบประมาณที่ใช้ไป/งบประมาณคงเหลือ
350,000.00 /350,000.00	349,999.50/0.50

นางสาวกมลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ วิศวกรชำนาญการ(ด้านสิ่งแวดล้อม)

งบบริหารจัดการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,019,580.00+300,000.00 บาท -17,129.00 บาท (ส่งคืน)
= 5,302,451.00 บาท (100%)

เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 4,495,416.81 บาท (84.78%) คงเหลือ 807,034.19 บาท (15.22%)

1. ค่าประกันสังคม (P11) จำนวน 94,500.00 บาท (คืน 7,129.00) เหลือ 87,371.00 บาท
2. ค่าเช่าบ้าน (P11) จำนวน 341,000.00 บาท
3. ค่าตอบแทนพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนใต้ (P11) จำนวน 75,000.00 บาท (คืน 10,000.00) เหลือ 65,000.00 บาท
4. งบบริหารจัดการ (P23) จำนวน 444,200.00 บาท + 300,000.00 บาท(รับจากโครงการ Bim)
5. ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23) จำนวน 3,094,200.00 บาท
6. ค่าจ้างเหมาบุคลากร เพิ่มเติม (P21) + (P51) จำนวน 24,000.00+ 12,000.00 บาท
7. สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ (P61)+ (P51) จำนวน 347,300.00+347,380.00 บาท
8. ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (P61) (P51) จำนวน 120,000.00+120,000.00 บาท

9. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคารและสิ่งก่อสร้าง (Database) (P61) จำนวน 400,000.00 บาท
10. โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการ และมุ่งผลสัมฤทธิ์ (P61)(P51) จำนวน 1,000,000.00 บาท
11. โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ (P61) จำนวน 350,000.00 บาท

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,750,000.00 บาท (100%)

เบิกจ่าย จำนวน 1,684,510.50 บาท (96.26%)

คงเหลือ 65,498.50 บาท (3.74%)

ตัวชี้วัดการรับรองการปฏิบัติราชการ งบประมาณ พ.ศ. 2566



ตัวชี้วัด	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินงาน
1.1.1 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายผ่านเกณฑ์มาตรฐานระบบบริการสุขภาพ	กลุ่มพัฒนาระบบบริการวิชาชีพ	ดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเกณฑ์ข้อกำหนด และรายงานผล การดำเนินงาน ในระบบ smart กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566
1.2.1 จำนวนการควบคุมงานก่อสร้างร่วมกัน ระหว่างกองแบบแผน ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพ ที่ 1 – 12	กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-12	
1.2.2 ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์สนับสนุน บริการสุขภาพ ที่ 1 – 12	กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-12	
1.2.3 จำนวนของการจัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการ พระราชดำริแล้วเสร็จ	นางสาวประภัสสร จิราภรณ์ กลุ่มออกแบบฯเขตที่ 1-13	
2. ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของผู้รับบริการต่อ งานบริการของหน่วยงาน	กลุ่มแผนงานและประเมินผล	
3. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการองค์กร ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน PMQA 4.0	งานนโยบายกิจกรรมพิเศษฯ	
4. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ (e-saraban) กรม สบส.	งานสารบรรณ	
5. ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ ควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง	งานนโยบายกิจกรรมพิเศษฯ	

แผนคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย	งบประมาณ
1	จัดการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลด้านอาคารและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพทุกระดับ	10 แห่ง	1,786,100.00
2	พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มระบบแบบจำลองสารสนเทศอาคารแบบสหวิทยาการและบูรณาการเพื่อการพัฒนาสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง ช่วงที่ 2	1 แบบจำลอง	7,810,000.00
3	จัดทำผังแม่บทโรงพยาบาลในโครงการพระราชดำริ	12 แห่ง	2,291,400.00
4	พัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ	12 แห่ง	2,291,400.00
5	พัฒนามาตรฐานสถาปัตยกรรมในระบบบริการสุขภาพตามแนวทางการออกแบบอาคารผังแม่บทและสภาพแวดล้อมของสถานบริการสุขภาพ	30 เล่ม	2,648,650.00
6	พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ.2567	530 คน	3,430,000.00
7	ประเมินอาคารภายหลังการใช้งาน (POE)	4 อาคาร	1,505,000.00
8	จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านอาคารและสภาพแวดล้อมสาธารณสุข	5 หลักสูตร	1,275,500.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน			21,626,610.00

The background is composed of several overlapping geometric shapes. A large, light blue parallelogram is the central element. To its left, a darker blue shape and a yellow shape with a vertical line pattern are visible. A thick yellow diagonal line runs from the top right towards the bottom center. The bottom of the image features a solid light blue area and a triangular orange shape on the left.

THANK YOU

สถานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2566 เดือน สิงหาคม 2566

โครงการ	งบประมาณที่ได้รับ	กันไว้	รวมใช้ไป	คงเหลือ
งบบริหารจัดการ งวดที่ 1,2,3				
ค่าเช่าบ้าน (P11)	341,000.00		298,709.00	42,291.00
เงินสมทบประกัน(P11) คื่น 7,129บาท 10 สค. 66(94500-7129)	87,371.00		78,929.00	8,442.00
ค่าตอบแทนภาคใต้(P11) คื่น 10,000 บาท (75,000-10,000) 10 สค.66	65,000.00	55,000.00	10,000.00	-
งบบริหารจัดการ (P23) (เพิ่ม222,100 ครั้งที่1) (เพิ่ม 100,000 ครั้งที่2)(เพิ่ม 122,100 ครั้งที่3)	444,200.00	14,611.26	315,102.97	114,485.77
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P23) 1,541,100 เพิ่มอีก 770,550)	2,311,650.00	-	2,311,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P61) งวดที่ 3	782,550.00	234,200.00	547,983.97	366.03
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P21) เพิ่มเติม	24,000.00	-	-	24,000.00
ค่าจ้างเหมาบุคลากร (P51) เพิ่มเติม 27มีค.66	12,000.00	-	-	12,000.00
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P61)	347,300.00	-	344,873.16	2,426.84
สนับสนุนดำเนินการตามภารกิจ (P51)	347,380.00	11,418.60	334,114.04	1,847.36
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P61	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าจ้างเหมาถ่ายเอกสาร P51 (27มีค.)	120,000.00	48,000.00	72,000.00	-
โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายการอาคาร และสิ่งก่อสร้าง (Database) (งวดที่1=169,200 งวดที่3= 230,800) กันใน Smart = 64,671 *คงอยู่*	400,000.00	203,420.00	131,909.00	64,671.00
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูงแบบสหวิทยาการและ มุ่งสูงผลสัมฤทธิ์P61 (งวดที่1= 680,800 งวดที่3= 416,880บาท)	1,097,680.00	496,880.00	600,800.00	-
โครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคาร สถานพยาบาลภาครัฐมารรณะสูงแบบสหวิทยาการและ มุ่งสูงผลสัมฤทธิ์ (งวดที่ 2 P51)	202,320.00	99,581.39	101,680.00	1,058.61
โครงการพัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับ สถานบริการสุขภาพ 350,000 กันใน Smart = 28,056 คื่น P23 = (12,990) ค่าจ้าง	350,000.00	148,052.50	201,947.50	-
	7,052,451.00	1,311,163.75	5,469,698.64	271,588.61
งบเบิกจ่ายแทนกัน (สป.)	500,000.00	-	396,798.82	103,201.18

[illegible]



คำสั่งกองแบบแผน

ที่ ๔๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกและสัมภาษณ์ จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก
ปฏิบัติงานโยธา และปฏิบัติงานเขียนแบบ

ตามที่กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานโยธา และปฏิบัติงานเขียนแบบ เพื่อช่วยปฏิบัติงานเขียนแบบงาน
สถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบ ที่ออกแบบใหม่ ต่อเติมปรับปรุง ซ่อมแซม
งานพิมพ์แบบเพื่อตรวจสอบ และแก้ไข ด้วยวิธีการคัดเลือกและสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๓ สิงหาคม
๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓ กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
และสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในตำแหน่งปฏิบัติงานโยธา และปฏิบัติงานเขียนแบบ ดังนี้

๑. นายณัฐสิทธิ์	สมบุญณวิทย์	สถาปนิกปฏิบัติการ	ประธานกรรมการ
๒. นางอังกุล	วรรณแสง	นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นางสาวสุภัทสร	บุญเป็ง	นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน	กรรมการ
๔. นางสาวเบญญาภา	โพธิ์ปิตกุล	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	เลขานุการ

โดยมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑. ดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. จัดทำรายงานสรุปผลการคัดเลือกและสัมภาษณ์และประกาศผล
๓. ตัดสินใจแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการคัดเลือกและสัมภาษณ์

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๔๓ /๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประชุม “อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Future of Designing Health Care Facilities to support Sustainability, Wellness & wellbeing)”

ตามคำสั่งกองแบบแผน ที่ ๓/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาแบบจำลองสารสนเทศอาคารสถานพยาบาลภาครัฐสมรรถนะสูง แบบสหวิทยาการและมุ่งผลสัมฤทธิ์ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการจัดประชุม เรื่อง อนาคตของการออกแบบสถาปัตยกรรมสาธารณสุขที่ยั่งยืนและดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Future of Designing Health Care Facilities to support Sustainability, Wellness & wellbeing โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. นายสรพงษ์	ทัฬหวิมล	ที่ปรึกษา
๒. นายณัฐสิทธิ์	สมบุญวิทย์	ที่ปรึกษา
๓. นายชาติศักดิ์กรินทร์	พาหุกุล	ที่ปรึกษา
๔. นายธนเศรษฐ์	ร่วมชาติ	ประธาน
๕. นางสาวกุลนันท์	สำราญใจ	คณะกรรมการ
๖. นางสาวฐาปณี	แพ่งคำ	คณะกรรมการ
๗. นายณัฐวุฒิ	สุขอรุณ	คณะกรรมการ
๘. นางสาวกุลทิรา	เทพสุภรณ์กุล	เลขานุการและคณะกรรมการ
๙. นางพรพรกร	ภูศรี	ผู้ช่วยเลขานุการ

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

- ๑) ประสานงาน การจัดงานประชุม ร่วมกับผู้จัด และวิทยากร
- ๒) ประชาสัมพันธ์ การจัดงานประชุมต่อกลุ่มเป้าหมาย
- ๓) ดำเนินการในส่วนของการรายงานการประชุม
- ๔) อำนวยความสะดวกด้านสถานที่จัดงานประชุม

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปฏิภาณ อินทร์ทอง)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (ด้านออกแบบและคำนวณ)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ที่ ๔๔ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับสถานบริการสุขภาพเพิ่มเติม

ตามที่ กองแบบแผน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสีย
สำหรับสถานบริการสุขภาพ ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานโครงการ
พัฒนาแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ
ตามวัตถุประสงค์แล้วนั้น ในการนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.
๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลน
ระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

๑. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๑

- ๑.๑ นายจิตติศักดิ์ เกื้อนช้าง คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑
- ๑.๒ นายนิติพงษ์ กัลหะ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑

๒. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๗

- ๒.๑ นายอรรถพล สุวรรณหงษ์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๗

๓. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๘

- ๓.๑ นายธวัชณ์ เหล็กกล้า คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๒ นายรัชชัย เดชบุรีรัมย์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๓ นายมารุต วงศ์กาฬสินธุ์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๔ นายสนธิ โครตสุวรรณ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘
- ๓.๕ นายกิตติชัย นามบุญมี คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๘

๔. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๙

- ๔.๑ นายสาวิทย์ นาคมิตร คณะทำงานย่อย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

๕. คณะกรรมการย่อยจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ เขตที่ ๑๑

- ๕.๑ นายภัทรธินันท์ ไชยวัฒน์ คณะทำงานย่อย
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

/๕.๒ นายอนิรุตร์...

๕.๒ นายอนิรุตร์ วิชัยดิษฐ์
ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑๑

คณะทำงานย่อย

โดยมีหน้าที่และอำนาจ ดังนี้

๑. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และสถาปัตยกรรม พร้อมประมาณราคาค่าก่อสร้าง
๒. รวบรวม รายงาน สรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแบบแปลนระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับสถานบริการสุขภาพ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน



คำสั่งกองแบบแผน

ที่ ๔๕/๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรกองแบบแผนปฏิบัติงาน

อนุสนธิ คำสั่งกองแบบแผน ที่ ๒๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรกองแบบแผนปฏิบัติงาน และเพื่อให้การปฏิบัติงานด้านมาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม สาธารณสุขของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อราชการเป็นสำคัญ ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ วรรค ๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ผู้อำนวยการกองแบบแผน จึงปรับปรุงแก้ไขคำสั่งการมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรกองแบบแผนปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐

นายปรีชา วัฒนศิริ

สถาปนิกชำนาญการ

๒. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๑

นายสุริยพงศ์ เบญจมานนท์

สถาปนิกปฏิบัติการ

๓. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๒

นางสาวฐาปนี แพงคำ

สถาปนิกปฏิบัติการ

๔. กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๓

นายสรพวัฒน์ งามผ่องใส

สถาปนิกปฏิบัติการ

๕. กลุ่มพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม

นางสาวกุลทิรา เทพสุภรณ์กุล

สถาปนิกปฏิบัติการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายถาวร ขาวแสง)

ผู้อำนวยการกองแบบแผน

แสดงความยินดี

- ยินดีต้อนรับข้าราชการ (รับโอน) ตำแหน่งสถาปนิกชำนาญการ จำนวน ๑ ราย
รายงานตัวเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
ปฏิบัติงานที่กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๑๐
นายปรีชา วัฒนศิริ

แสดงความเสียใจ

- ▶ นายภู่านาชะห์ฮัจยีสายันต์ ทิมเจริญ บิดา นายอำพร ทิมเจริญ นายช่างโยธาอาวุโส
กลุ่มออกแบบและกำกับการก่อสร้างเขตที่ ๔ ถึงแก่กรรมและทำพิธีละหมาด
เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
